PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-6

Fase 3 · Analisis Kebutuhan



Kelompok · Kelas

Kelompok 1 · 4KA22

Proyek · Klien

Perancangan Aplikasi Web Scevra Parfume · Fiolim Amadeo

Pelapor · Tanggal

Alyssa Salma · 02 November 2026

ANGGOTA KELOMPOK



Alyssa Salma

Project Manager



Adrian Taufiqurrahman

System Analyst



Alif Rahman

Programmer



Amanda Talitha

UI/UX Designer



Cyntia Gladies

Tester & Technical Writer



Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

42%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

42%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**





Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
3.5	Penyusunan dan Review SRS bersama Klien	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Selesai	✓
3.4	Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW)	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Selesai	✓
3.3	Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Selesai	✓
3.2 , 3.1	Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional dan validasi kebutuhan dari klien	Adrian Taufiqqurahman	26 Oktober	Selesai	✓

Selesai 5 dari 5 tugas

Status: ✓ Selesai · ~~Terlambat~~ · ~~Revisi~~ · ~~Belum (sesuai aturan main PPSI)~~






Hasil kerja minggu ini


Penyesuaian Use Case Diagram

- kode 3.3 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.2

Menyesuaikan Use Case dengan kebutuhan Klien dari Sisi Admin dan pelanggan

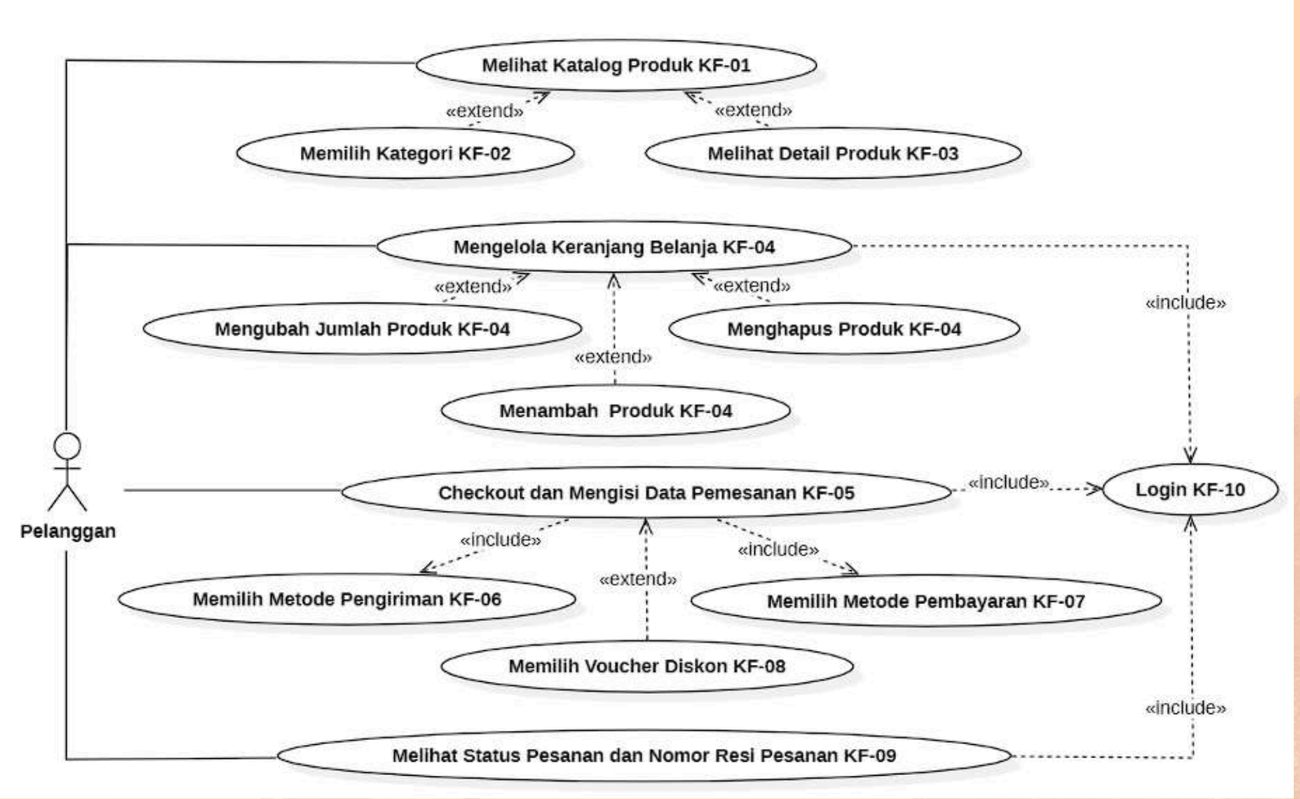

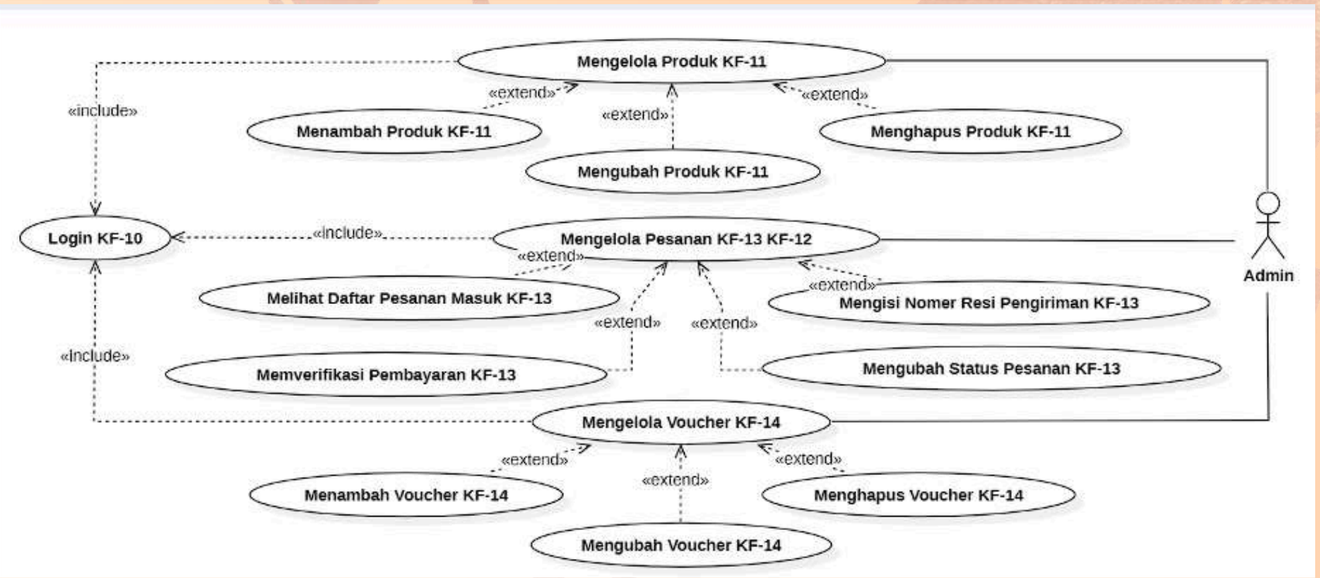



Hasil kerja minggu ini

Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW)

- kode 3.4 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.1

Pembuatan Spesifikasi UC dan User Story

- kode 3.5 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.3 , 4.4

Melakukan Penyusunan kebutuhan berdasarkan Usecase yang telah dibuat

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus menampilkan katalog produk parfum beserta foto, nama, dan harga.	Pelanggan	Must	W-01	F-02
KF-02	Sistem harus menyediakan penyaringan produk berdasarkan nama atau gender.	Pelanggan	Should	RD 6.1	F-02
KF-03	Sistem harus menampilkan detail produk: foto, harga, stok, deskripsi, dan pilihan ukuran.	Pelanggan	Must	W-01, RD 5.1	F-03
KF-04	Sistem harus memungkinkan pelanggan menambah, mengubah jumlah, dan menghapus produk di keranjang belanja.	Pelanggan	Must	W-02	F-04
KF-05	Sistem harus menyediakan checkout dengan pengisian data pemesan (nama, kontak, alamat).	Pelanggan	Must	W-02	F-06

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat katalog produk parfum agar dapat mengetahui produk yang tersedia beserta harga dan fotonya.	1. Sistem menampilkan daftar produk parfum yang tersedia. 2. Setiap produk menampilkan foto, nama, dan harga. 3. Jika tidak ada produk, sistem menampilkan informasi bahwa produk tidak ditemukan.	UC-02
US-02	Sebagai pelanggan, saya ingin menyaring produk berdasarkan kategori gender agar dapat menemukan parfum yang sesuai dengan preferensi saya.	1. Sistem menyediakan pilihan kategori gender, yaitu Pria, Wanita, dan Unisex. 2. Sistem menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih. 3. Jika tidak ada produk yang sesuai, sistem menampilkan informasi bahwa produk tidak ditemukan.	UC-02

4.3 Spesifikasi Use Case

ID / Nama	UC-01 / Login
Aktor	Pelanggan, Admin
Kebutuhan terkait	KF-10
Deskripsi	Aktor melakukan autentikasi ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur-fitur yang membutuhkan hak akses khusus seperti mengelola keranjang belanja, checkout, melihat status pesanan dan nomor resi, mengelola produk, mengelola pesanan dan mengelola voucher.
Prakondisi	Aktor berada di halaman Login sistem.
Alur utama	1. Aktor memasukkan username/email dan kata sandi. 2. Aktor menekan tombol "Login". 3. Sistem memvalidasi data akun. 4. Sistem mengenali hak akses akun (Role) dan mengarahkan aktor ke halaman beranda sesuai dengan masing masing hak akses.




Hasil kerja minggu ini

Penyusunan dan Review SRS bersama Klien

- kode 3.5 WBS

Melakukan Penyesuain pada SRS dan Permintaan Persetujuan dari Klien berupa Tanda Tangan
Melalui Google Meet

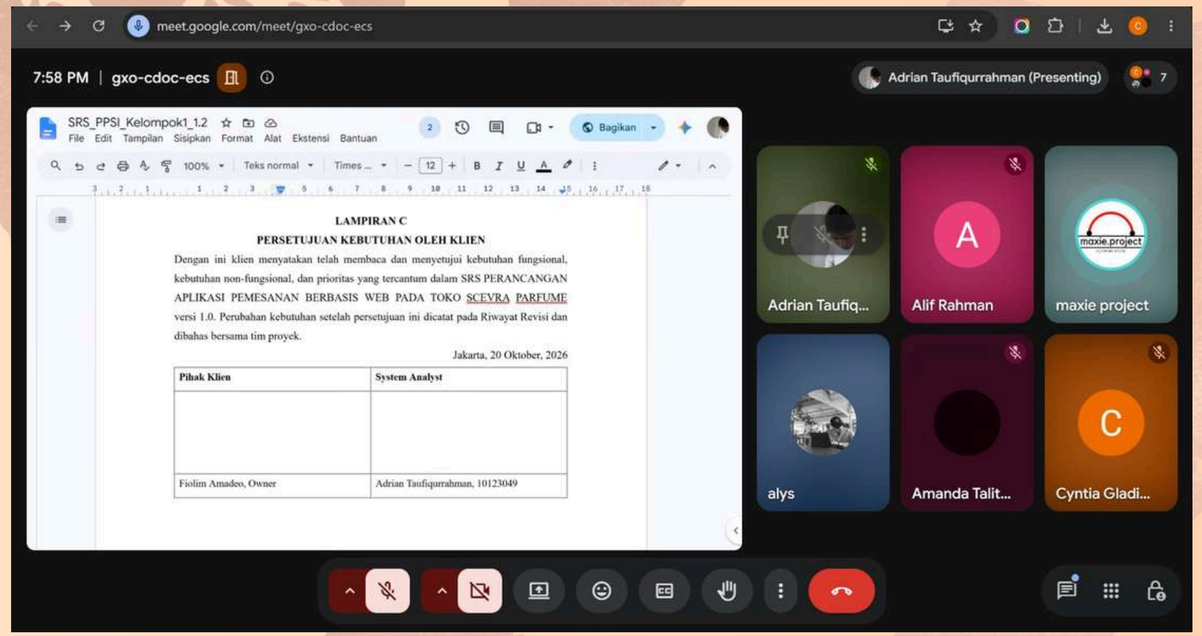



Kontribusi anggota Minggu 6 (Penyusunan SRS)

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Alyssa Salma	Project Manager	3.5 Memimpin rapat klien	8 jam
Adrian Taufiqurrahman	System Analyst	3.5 Menyusun SRS	8 jam
Amanda Talitha	System Designer	3.5 Membuat Diagram	8 jam
Alif Rahman	Programmer	3.5 Menyusun PPT	8 jam
Cyntia Gladies	Tester	3.5 Menyusun PPT, upload dokumentasi	8 jam
	Technical Writer		

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.



Komunikasi dengan klien

Pertemuan

- 9 Oktober 2026 · WhatsApp
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim
- 17 Oktober 2026 · tatap muka
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim
- 01 November 2026 · Google Meet
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim

Yang dibahas

- Alur website, mulai dari pemilihan produk, checkout, hingga proses pemesanan.
- Metode pembayaran, yaitu QRIS manual atau menggunakan payment gateway Midtrans.
- Biaya penggunaan Midtrans serta ketentuan biaya transaksi.
- Konsep tampilan website, meliputi pemilihan warna dan jenis font yang akan digunakan.

Masukan dan keputusan klien

Klien menyetujui alur website dan penggunaan Midtrans dengan metode pembayaran QRIS. Biaya transaksi akan disesuaikan melalui harga jual produk. Tampilan website mengacu pada Octarine dengan desain minimalis berwarna hitam dan putih, sedangkan font akan disesuaikan dengan logo yang dibuat klien.

Perubahan kebutuhan

Tidak ada perubahan kebutuhan.

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-01	Klien sulit ditemui	Tinggi	Jadwal rutin tiap Sabtu, konfirmasi H-1	PM
R-02	Ruang lingkup terus bertambah (fitur baru diminta di tengah jalan)	Sedang	Kunci ruang lingkup di dokumen persetujuan, perubahan lewat form khusus	SA

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

tidak ada



Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.1	Perancangan Arsitektur Sistem	Amanda Talitha	16 November
4.2	Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel)	Amanda Talitha	16 November
4.3	Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile)	Amanda Talitha	23 November
4.4	Penyusunan Software Design Document (SDD)	Cyntia Gladies	16 November
4.5	Review Desain dengan Klien	Alyssa Salma	23 November

JATUH TEMPO

Pertemuan klien: 01 November 2026





THANK YOU



