# DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK
# PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

| | |
|---|---|
| **Nama Klien** | Fiolim Amadeo (Owner, Scevra Parfume |
| **Kelompok / Kelas** | Kelompok 1 / 4KA22 |
| **Project Manager** | Alyssa Salma, 10123131 |
| **Dosen Pengampu** | Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I |
| **Tanggal / Versi** | 18 Oktober 2026 / Versi 1.0 |

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

| | |
|---|---|
| **Masalah utama klien** | Kenaikan biaya administrasi di marketplace (Shopee dan TikTok) menurunkan keuntungan klien yang berjualan sebagai reseller parfum. Klien ingin membangun brand sendiri, Scevra Parfume, dan menjual secara mandiri lewat website resmi dan media sosial. |
| **Solusi terpilih** | Aplikasi web e-commerce dengan katalog dan detail produk, keranjang, voucher, checkout, pemilihan pengiriman, dan pembayaran QRIS/transfer untuk pelanggan, serta pengelolaan produk, pesanan, dan voucher untuk admin. |
| **Metodologi** | Agile (iteratif dan inkremental): dokumen berurutan pada Minggu 1–8, pemrograman dalam 3 iterasi (sprint) pada Minggu 9, 10, dan 12 dengan demo progres kepada klien. |


| | |
|---|---|
| **Perubahan sejak Bagian I** | Tidak ada perubahan ruang lingkup. Perencanaan mengikuti Tabel Ruang Lingkup (RD Bagian 2.2): laporan penjualan, integrasi marketplace Shopee/TikTok, pelacakan kurir otomatis, sistem member, laporan penjualan, dan iklan digital tidak termasuk. |

## 1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk Fase Perencanaan (Minggu 3–4) untuk menggambarkan proses bisnis saat ini dan proses bisnis usulan Toko Scevra Parfume, merancang sistem secara garis besar, menilai kelayakan solusi terpilih dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional, serta menetapkan rincian pekerjaan (WBS) dan jadwal proyek (Gantt Chart) yang akan dipantau hingga serah terima. Rancangan detail (arsitektur, ERD, wireframe) disusun pada SDD di Minggu 7–8.

## 2. GAMBARAN PROSES BISNIS

### 2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)

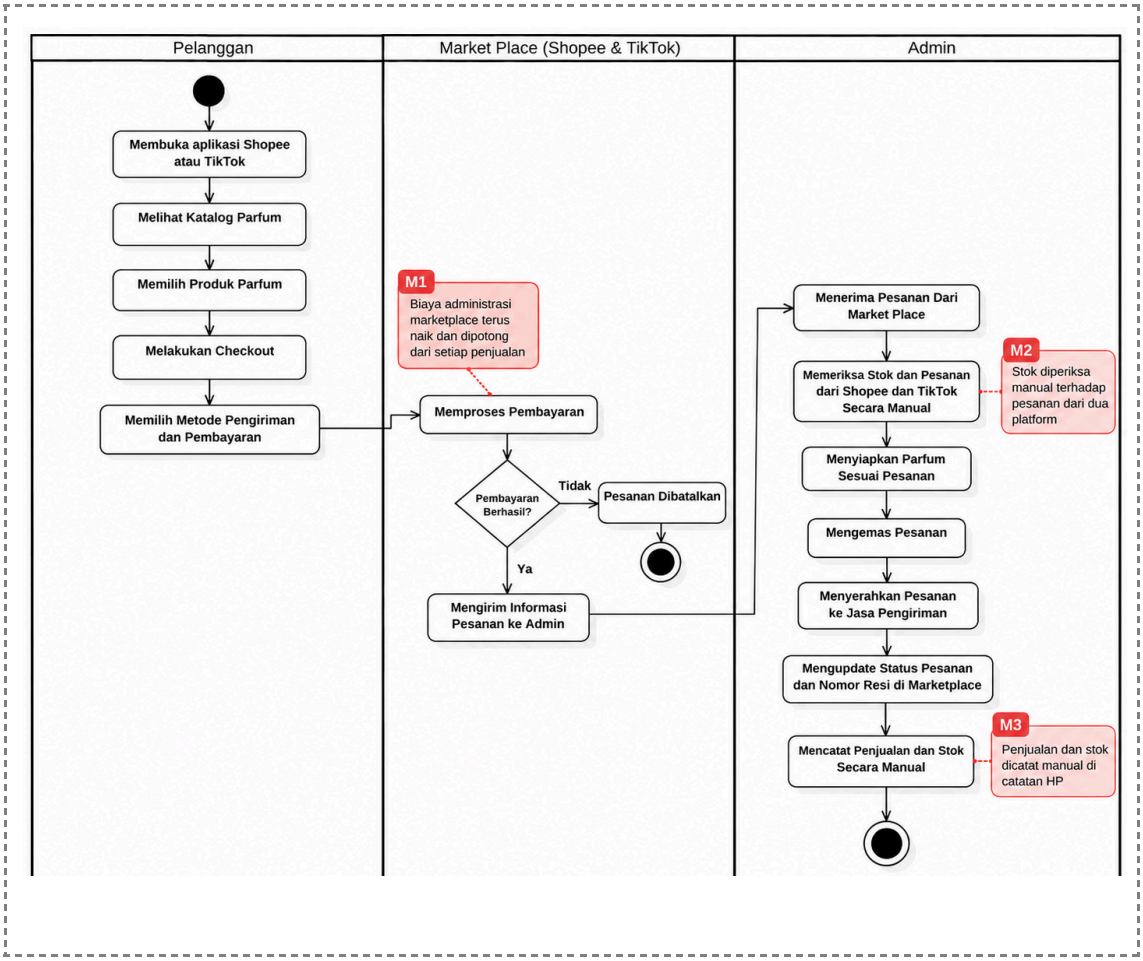


**Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini**

Klien saat ini berjualan sebagai reseller parfum melalui Shopee dan TikTok selama kurang lebih satu tahun. Proses pemesanan dilakukan melalui marketplace, Langkah-langkah proses bisnis yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut:


1. Pelanggan membuka Shopee atau TikTok, melihat katalog parfum, memilih produk, kemudian melakukan checkout.
2. Pelanggan memilih metode pengiriman dan pembayaran melalui marketplace. Marketplace memproses pembayaran dan meneruskan informasi pesanan kepada admin setelah pembayaran berhasil.
3. Admin menerima pesanan dari marketplace, kemudian menyiapkan parfum sesuai pesanan dan mengemasnya.
4. Admin menyerahkan pesanan kepada jasa pengiriman, kemudian memperbarui status pesanan dan nomor resi di marketplace.

5. Setelah transaksi selesai, pemilik mencatat data penjualan secara manual menggunakan Excel. Proses ini masih bergantung pada pencatatan manual dan biaya administrasi marketplace yang meningkat menjadi salah satu kendala dalam menjalankan usaha.

Titik masalah pada proses saat ini (ditandai M1–M4 pada diagram):

| Kode | Titik Masalah | Dampak | Sumber |
|---|---|---|---|
| M1 | Biaya administrasi marketplace terus naik dan dipotong dari setiap penjualan | Keuntungan usaha menurun | Wawancara pemilik, 9 Okt 2026 |
| M2 | Stok diperiksa manual terhadap pesanan yang masuk dari dua platform | Risiko selisih stok dan pesanan melebihi stok | Alur kerja saat ini |
| M3 | Penjualan dan stok dicatat manual di catatan HP | Rekap memakan waktu dan data tidak terpusat | RD Bagian 7 |

## 2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)

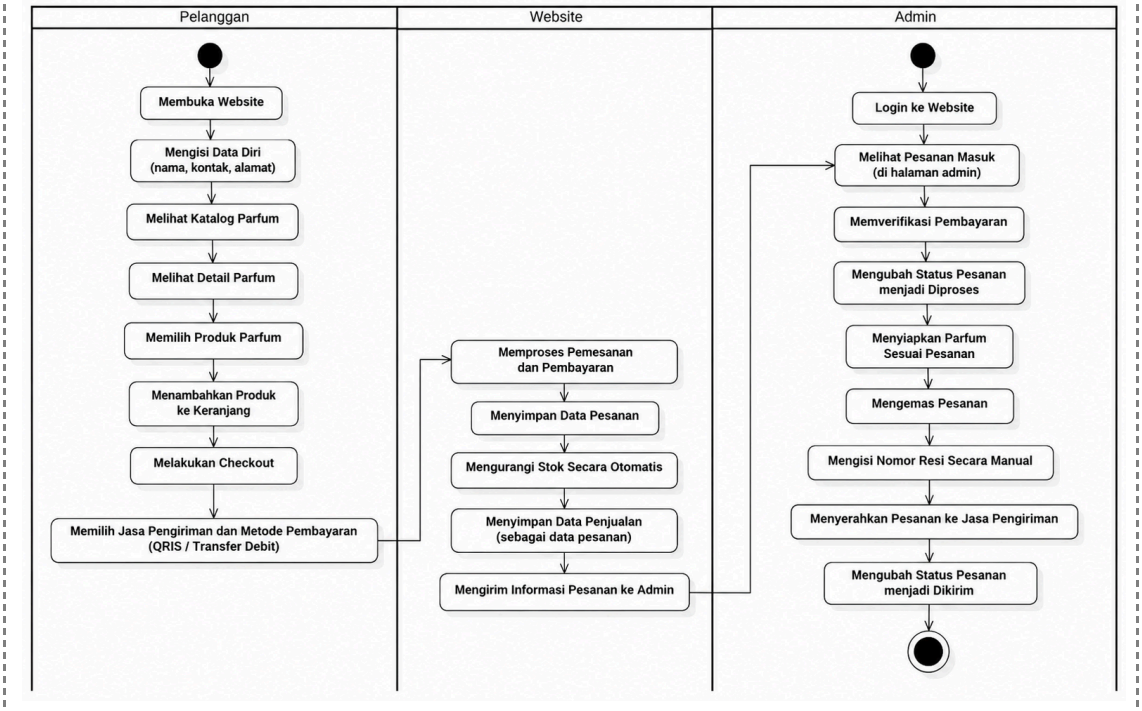



**Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan**

| Langkah / Aktivitas | Saat Ini (As-Is) | Usulan (To-Be) | Perbaikan |
|---|---|---|---|
| Pemilihan produk | Pelanggan mencari di Shopee/TikTok; tampilan dan promosi diatur platform | Pelanggan membuka katalog dan detail produk di website Scevra | Branding dan tampilan dikelola sendiri oleh klien |
| Checkout dan pemesanan | Dilakukan di dalam marketplace | Pelanggan mengisi nama, kontak, alamat, memilih ekspedisi, dan memakai voucher | Data pelanggan tersimpan di sistem admin promo voucher sendiri |
| Pembayaran | Lewat marketplace; dana cair setelah dipotong biaya admin | QRIS atau transfer debit langsung ke toko, diverifikasi admin | Tidak ada potongan biaya admin marketplace |
| Penerimaan pesanan | Notifikasi dari aplikasi penjual marketplace | Daftar pesanan masuk di halaman admin dan email konfirmasi | Pesanan website terpusat di satu tempat |
| Pengecekan stok | Dicek manual | Stok berkurang otomatis saat pesanan dibuat dan kembali bila dibatalkan | Selisih stok dan pesanan melebihi stok berkurang |
| Pengiriman | Resi dicetak dari marketplace | Pelanggan memilih ekspedisi; admin mengisi nomor resi manual | Resi tercatat pada data pesanan |

## 3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

### 3.1 Gambaran Umum Sistem

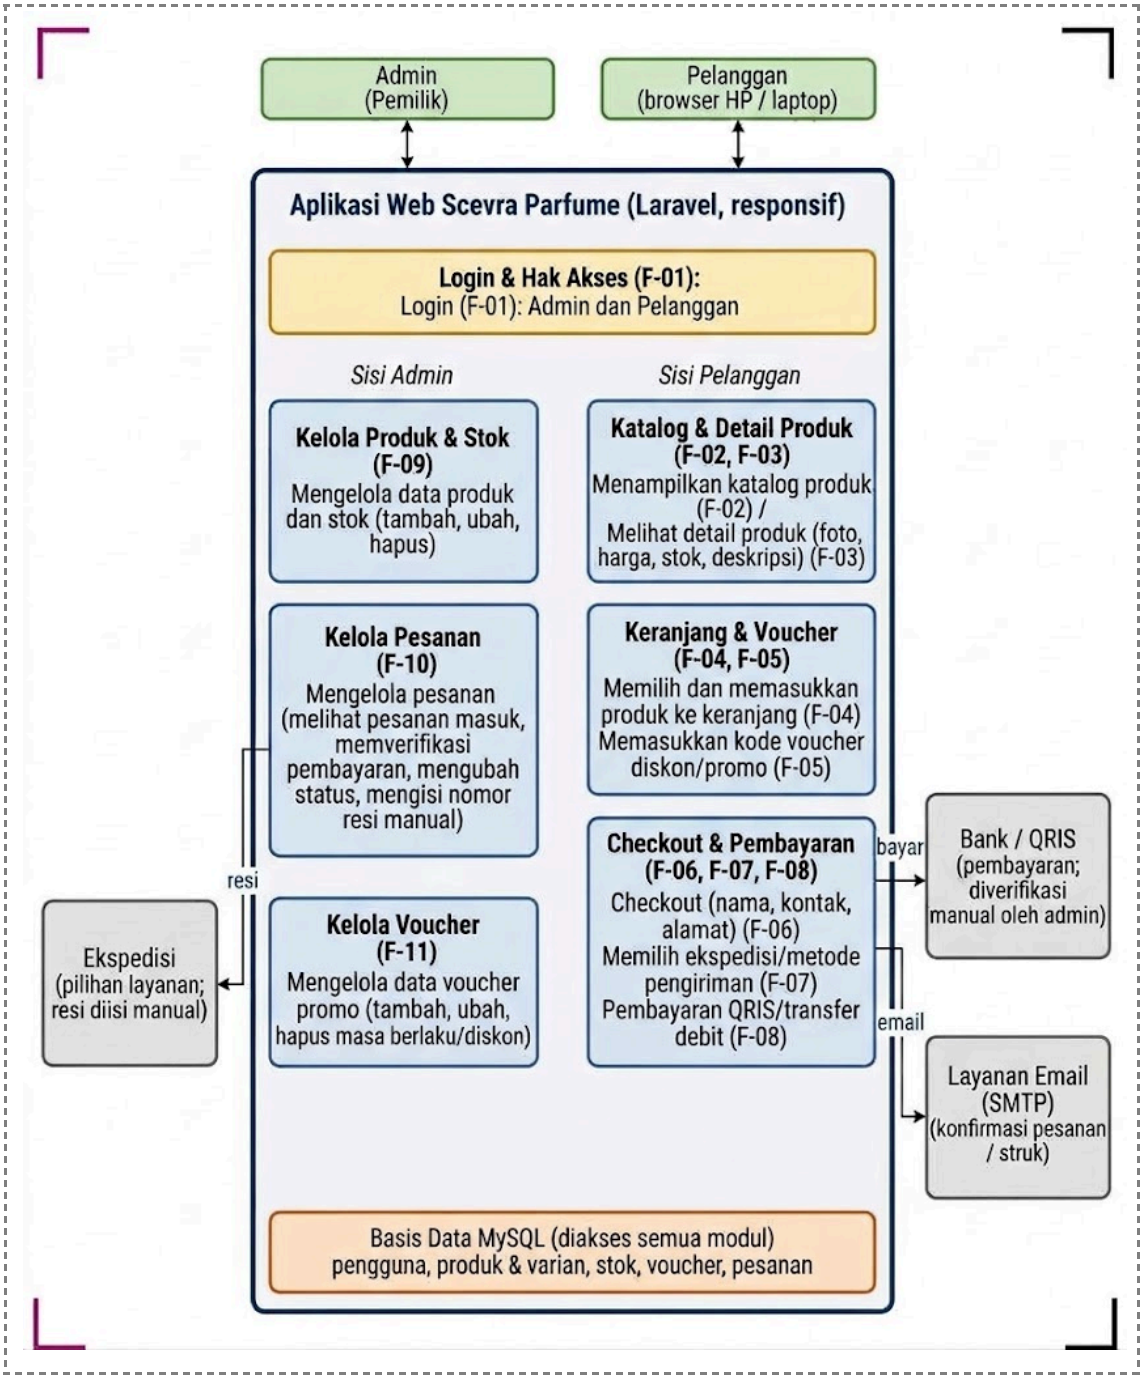


**Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem**

### 3.2 Modul / Komponen Utama

| Modul | Fungsi | Pengguna | Fungsi RD (Bagian I) | Terhubung dengan |
|---|---|---|---|---|
| Autentikasi & Hak Akses | Login/logout dan pembedaan hak akses admin dan pelanggan | Admin, Pelanggan | F-01 | Semua modul |
| Katalog & Detail Produk | Menampilkan katalog parfum, memilih jenis parfum berdasarkan nama atau gender, dan detail produk (foto, harga, stok, deskripsi, varian 25 ml/50 ml) | Pelanggan | F-02 | Kelola Produk & Stok, Keranjang |
| Keranjang & Voucher | Menambah, mengubah, dan menghapus item keranjang, menghitung total, dan memasukkan kode voucher | Pelanggan | F-03, F-04, F-05 | Katalog, Kelola Voucher, Checkout |
| Checkout & Pembayaran | Mengisi data pemesan, memilih ekspedisi, memilih QRIS/transfer debit, dan menampilkan instruksi serta konfirmasi pembayaran | Pelanggan | F-06, F-07, F-08 | Keranjang, Kelola Pesanan, Notifikasi & Cetak |

| Modul | Fungsi | Pengguna | Fungsi RD (Bagian I) | Terhubung dengan |
|---|---|---|---|---|
| Kelola Produk & Stok | Menambah, mengubah, dan menghapus produk, varian, harga, dan stok | Admin | F-09 | Katalog, Checkout (pengurangan stok) |
| Kelola Pesanan | Melihat pesanan masuk, mengubah status, mengisi nomor resi manual, | Admin, | F-10 | Checkout, Kelola Produk & Stok, Notifikasi & Cetak |
| Kelola Voucher | Menambah, mengubah, dan menghapus voucher (diskon dan masa berlaku) | Admin | F-11 | Keranjang & Voucher |
| Autentikasi & Hak Akses | Login/logout dan pembedaan hak akses admin dan pelanggan | Admin, Pelanggan | F-01 | Semua modul |
| Katalog & Detail Produk | Menampilkan katalog parfum, memilih jenis parfum berdasarkan nama atau gender, dan detail produk (foto, harga, stok, deskripsi, varian 25 ml/50 ml) | Pelanggan | F-02 | Kelola Produk & Stok, Keranjang |

### 3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

| Komponen | Rencana | Alasan Pemilihan |
|---|---|---|
| Platform / jenis aplikasi | Aplikasi web responsif (Alternatif A) | Dapat dibuka dari HP dan laptop tanpa instalasi, sesuai temuan wawancara dan fokus tampilan untuk desktop dan mobile portrait |
| Bahasa & framework | PHP 8.x dengan framework Laravel (Blade), HTML/CSS/JavaScript | Framework matang dengan autentikasi, validasi, dan ORM bawaan sehingga menghemat waktu; dokumentasi luas untuk tim yang masih belajar |
| Basis data (DBMS) | MySQL | Relasional, cocok untuk data produk, stok, voucher, dan pesanan; tersedia di hampir semua hosting; beban 25–28 transaksi/bulan sangat ringan |
| Server uji & produksi | Uji menggunakan localhost Produksi: shared hosting PHP/MySQL dengan domain sendiri dan HTTPS | Sesuai anggaran RD (hosting Rp100–200 rb/bulan); pengembangan lokal tidak berbiaya |
| Pembayaran & notifikasi | QRIS/transfer debit dengan verifikasi manual admin; email konfirmasi lewat SMTP | Tanpa biaya payment gateway; cukup untuk volume pesanan saat ini |

## 4. ANALISIS KELAYAKAN

Penilaian memakai data dari RD Bagian I: perkiraan 25–28 transaksi per bulan dengan 2 varian produk (25 ml dan 50 ml), biaya hosting Rp100–200 rb per bulan dan

domain Rp50–150 rb per bulan (RD Bagian 2.3), serta perangkat dan koneksi yang dimiliki klien (RD Bagian 6.3).

### 4.1 Kelayakan Teknis

| Aspek | Kebutuhan Solusi | Kondisi Saat Ini | Kesimpulan |
|---|---|---|---|
| Perangkat keras | Laptop/PC dan smartphone untuk admin, serta server hosting | Klien memiliki 1 laptop Windows 10, 1 smartphone Android dan server memakai shared hosting | Layak |
| Perangkat lunak | PHP, MySQL, browser modern (Chrome, Edge), Git/GitHub | Seluruhnya gratis atau open source, browser sudah tersedia di perangkat klien | Layak |
| Jaringan / internet | Koneksi stabil untuk mengakses website dan menerima pesanan | WiFi dan data seluler tersedia; beban 25–28 transaksi/bulan sangat ringan bagi shared hosting | Layak |
| Kemampuan tim | Menguasai PHP, MySQL, desain antarmuka responsif, dan pengujian | Tim 5 orang masih belajar dan baru pertama kali menangani klien nyata (RD Bagian 4.2; risiko R-04) | Layak bersyarat: belajar Laravel pada Minggu 3–6 |
| Kemampuan pengguna | Pemilik mengelola produk, pesanan, dan voucher lewat halaman admin | Pemilik sudah mengelola toko online di Shopee dan TikTok | Layak |

### 4.2 Kelayakan Ekonomi

Biaya jasa tim (mahasiswa) tidak dibayar klien, tetapi dihitung sebagai nilai pasar dengan asumsi Rp8.000.000, yaitu perkiraan harga jasa pembuatan website toko

online sederhana. Biaya hosting dan domain memakai nilai tengah dari RD: hosting Rp150.000 dan domain Rp100.000 per bulan, total Rp250.000 per bulan. Sesuai RD, 3–6 bulan pertama ditanggung tim (dihitung 6 bulan) dan sisanya oleh klien.

| Komponen Biaya | Jenis | Jumlah (Rp) | Ditanggung oleh |
|---|---|---|---|
| Domain & hosting bulan 1–6 (6 × Rp250.000) | Operasional / tahun | 1.500.000 | Tim |
| Domain & hosting bulan 7–12 (6 × Rp250.000) | Operasional / tahun | 1.500.000 | Klien |
| Perangkat tambahan (laptop, internet, printer) | Pengembangan (sekali) | 0 | Sudah dimiliki klien dan tim |
| Pelatihan & dokumentasi (user manual, BAST, pelatihan 1,5 jam) | Pengembangan (sekali) | 0 | Tim |
| Jasa pengembangan tim (nilai pasar, asumsi) | Pengembangan (sekali) | 8.000.000 | Tim (tidak ditagihkan) |
| **Total tahun pertama** | | **11.000.000** | **Klien: 1.500.000 (tunai)** |

Manfaat dihitung per tahun dari data RD dan asumsi tim berikut (asumsi bertanda * akan divalidasi dengan klien pada Minggu 4):

- 27 transaksi per bulan (tengah dari 25–28, RD Bagian 6.1), tumbuh 25% per tahun (RD Bagian 6.2).
- Rata-rata nilai pesanan Rp150.000 (campuran varian 25 ml dan 50 ml).
- Total biaya marketplace (komisi, biaya layanan, program) sekitar 14% dari nilai pesanan.
- 70% pesanan dialihkan ke website pada tahun pertama.
- Hemat waktu pencatatan dan rekap sekitar 5 jam per bulan dengan nilai waktu pemilik Rp20.000 per jam.

| Manfaat | Berwujud / Tidak Berwujud | Perkiraan Nilai per Tahun |
|---|---|---|
| Hemat biaya marketplace: 27 × 12 × Rp150.000 × 14% × 70% | Berwujud | Rp4.762.800 |
| Hemat waktu rekap dan pencatatan: 5 jam × 12 × Rp20.000 | Berwujud | Rp1.200.000 |
| Mengurangi selisih stok dan pesanan melebihi stok | Tidak berwujud | – |
| Branding sendiri dan data pelanggan langsung | Tidak berwujud | – |
| **Total manfaat berwujud (tahun 1)** | | **Rp5.962.800** |

Proyeksi 3 tahun (manfaat penghematan marketplace naik 25% per tahun mengikuti pertumbuhan transaksi; biaya domain dan hosting Rp3.000.000 per tahun):

| Tahun | Manfaat Berwujud | Biaya Operasional | Manfaat Bersih | Kumulatif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp5.962.800 | Rp3.000.000 | Rp2.962.800 | Rp2.962.800 |
| 2 | Rp7.153.500 | Rp3.000.000 | Rp4.153.500 | Rp7.116.300 |
| 3 | Rp8.641.875 | Rp3.000.000 | Rp5.641.875 | Rp12.758.175 |

**Analisis:** Jika jasa tim Rp8.000.000 diperlakukan sebagai investasi awal, maka Payback Period tercapai pada tahun ke-3, yaitu sekitar 2 tahun 2 bulan (kumulatif Rp7.116.300 pada akhir tahun ke-2, sisa Rp883.700 tertutup oleh manfaat bersih tahun ke-3 sebesar Rp5.641.875). ROI 3 tahun = (Rp21.758.175 − Rp17.000.000) ÷ Rp17.000.000 × 100% ≈ 28%. Bagi klien, jasa tim tidak dibayar, sehingga biaya tunai tahun pertama hanya Rp1.500.000 dan manfaat bersih tahun pertama sekitar Rp4.462.800. Agar penghematan menutup biaya hosting dan domain, sekitar 27% pesanan perlu beralih ke website: (Rp3.000.000 − Rp1.200.000) ÷ Rp6.804.000 ≈ 26,5%. Artinya proyek layak secara ekonomi, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada keberhasilan klien mengarahkan pelanggan ke website.

### 4.3 Kelayakan Operasional

| Aspek | Penilaian | Kesimpulan |
|---|---|---|
| Dukungan pemilik/manajemen | Pemilik sendiri yang mengajukan kebutuhan (menekan biaya marketplace), bersedia diwawancarai pada 9 Oktober 2026 via chat WhatsApp dan 17 Oktober 2026 bertemu langsung di Cafe, dan telah menandatangani Lembar Persetujuan RD pada 17 Oktober 2026 | Layak |

| Aspek | Penilaian | Kesimpulan |
|---|---|---|
| Kesiapan & penerimaan pengguna | Pemilik terbiasa mengelola toko online, alur belanja (pilih produk, checkout, pengiriman, pembayaran) serupa dengan marketplace | Layak |
| Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2) | Alur To-Be mengikuti alur yang sudah dijalankan klien. Tambahan pekerjaan admin hanya verifikasi pembayaran dan input resi manual, dengan beban sekitar 25–28 pesanan per bulan | Layak |
| Kemampuan klien memelihara sistem | Pemilik dapat mengelola produk, pesanan, dan voucher sendiri. Perawatan teknis (hosting, perbaikan bug) belum ada tenaga ahli, tim mendukung 1 bulan setelah BAST dan klien perlu memperpanjang hosting dan domain sendiri | Layak bersyarat |

### 4.4 Risiko Terkait Kelayakan

| ID | Risiko | Aspek | Peluang | Dampak | Mitigasi |
|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | Hosting dan domain belum dibayar atau diperpanjang klien saat deploy atau setelah masa 3–6 bulan | Ekonomi | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal pembayaran sebelum Minggu 12 dan catat tanggal perpanjangan di BAST |

| ID | Risiko | Aspek | Peluang | Dampak | Mitigasi |
|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Pelanggan lambat beralih dari marketplace ke website sehingga manfaat di bawah perkiraan | Ekonomi | Sedang | Sedang | Klien mempromosikan website lewat media sosial dan voucher perkenalan; pantau target titik impas ±27 pesanan |
| R-10 | Update status pesanan manual terlambat saat admin sibuk | Operasional | Sedang | Sedang | Email notifikasi pesanan masuk dan jadwal cek pesanan harian pada jam operasional |
| R-11 | Tampilan tidak optimal di berbagai ukuran layar HP dan desktop | Teknis | Sedang | Sedang | Wireframe responsif sejak desain; uji di Chrome/Edge dan beberapa ukuran layar pada Minggu 13 |
| R-12 | Jadwal sprint padat karena Minggu 11 (UTS) tidak dapat dipakai pengerjaan | Jadwal | Tinggi | Sedang | Prioritaskan fitur inti pada Sprint 1–2; fitur chat dan voucher dapat disederhanakan; Minggu 16 sebagai cadangan |

### 4.5 Kesimpulan Kelayakan

| Aspek | Hasil | Catatan |
|---|---|---|
| Teknis | Layak bersyarat | Teknologi tersedia dan ringan, syaratnya tim mempelajari Laravel pada Minggu 3–6 dan menguji tampilan responsif |
| Ekonomi | Layak | Biaya tunai klien kecil (Rp1.500.000 pada tahun pertama), manfaat positif bila ±27 pesanan beralih ke website, asumsi akan divalidasi klien |
| Operasional | Layak | Pemilik berpengalaman dan mendukung penuh, syaratnya data produk tersedia paling lambat Minggu 5 dan verifikasi pembayaran dilakukan tepat waktu |

Kesimpulannya, proyek dilanjutkan ke Fase Analisis Kebutuhan dengan syarat (1) klien memvalidasi asumsi nilai pesanan dan biaya marketplace pada Minggu 4, (2) klien menyediakan data produk dan stok awal paling lambat Minggu 5, (3) klien menyiapkan pembayaran hosting dan domain sebelum Minggu 12, dan (4) tim menjadwalkan sesi belajar Laravel bersama.

## 5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

WBS memecah seluruh pekerjaan menjadi 9 paket level 1 (7 fase perkuliahan ditambah Manajemen Proyek dan Cadangan Minggu 16) dan paket kerja level 2 yang dapat ditugaskan. Aturan 100% dipenuhi: seluruh pekerjaan proyek tercakup dan tidak ada yang tumpang tindih; pekerjaan di luar ruang lingkup RD (misalnya integrasi marketplace dan pengelolaan toko offline) tidak dimasukkan.

## 5.1 Diagram WBS




**Gambar 5.1 Work Breakdown Structure**

## 5.2 Kamus WBS

| Kode | Paket Kerja | Deliverable | PIC (Peran) | Durasi (hari) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Proyek | Notulen, laporan status | PM | 112 (sepanjang proyek) |

| Kode | Paket Kerja | Deliverable | PIC (Peran) | Durasi (hari) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rapat mingguan tim & klien | Notulen | PM | 112 (mingguan) |
| 1.2 | Pemantauan jadwal & risiko | Gantt (realisasi), daftar risiko | PM | 112 (mingguan) |
| **2** | **Definisi Proyek** | **Requirement Document** | **SA** | **14** |
| 2.1 | Identifikasi klien & masalah | Hasil wawancara (9 & 17 Okt) | SA | 7 |
| 2.2 | Penetapan tujuan, ruang lingkup & metodologi | Bagian 2–4 RD | SA | 4 |
| 2.3 | Penyusunan RD & persetujuan klien | RD v1.3 + lembar persetujuan | SA | 3 |
| **3** | **Perencanaan** | **Dokumen 01 Bag. II, Gantt Chart** | **PM** | **14** |
| 3.1 | Proses bisnis & gambaran sistem | Bagian 2–3 dokumen ini | SA | 5 |
| 3.2 | Analisis kelayakan | Bagian 4 dokumen ini | PM | 5 |
| 3.3 | WBS & Gantt Chart | Bagian 5–7, file Gantt | PM | 4 |
| **4** | **Analisis Kebutuhan** | **SRS** | **SA** | **14** |
| 4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | Catatan kebutuhan detail | SA | 5 |
| 4.2 | Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional | Draf SRS | SA | 6 |
| 4.3 | Review SRS bersama klien | SRS final | SA | 3 |
| **5** | **Desain Sistem** | **SDD** | **SD** | **14** |
| 5.1 | Perancangan basis data (ERD) | ERD & kamus data | SD | 5 |
| 5.2 | Perancangan arsitektur & alur sistem | Diagram arsitektur, UML | SD | 5 |
| 5.3 | Perancangan antarmuka (wireframe responsif) | Wireframe HP & desktop | SD | 7 |
| 5.4 | Penyusunan & review SDD | SDD | SD | 2 |
| **6** | **Pemrograman** | **Aplikasi, dok. implementasi** | **Programmer** | **28*** |
| 6.1 | Sprint 1 – fitur dasar (F-01, F-02, F-03, F-09) | Login, katalog, detail & kelola produk | Programmer | 7 |
| 6.2 | Sprint 2 – transaksi (F-04 s.d. F-08, F-11) | Keranjang, voucher, checkout, pembayaran | Programmer | 7 |

| Kode | Paket Kerja | Deliverable | PIC (Peran) | Durasi (hari) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Sprint 3 – pesanan & penyempurnaan (F-10) | Kelola pesanan, cetak, email, chat | Programmer | 7 |
| 6.4 | Penyusunan dokumen implementasi | Dokumen implementasi | Tech. Writer | 7 |
| **7** | **Pengujian** | **Skenario uji & hasil UAT** | **Tester** | **7** |
| 7.1 | Penyusunan skenario & data uji | Skenario pengujian | Tester | 2 |
| 7.2 | Pengujian modul, integrasi & perbaikan bug | Laporan pengujian | Tester | 3 |
| 7.3 | User Acceptance Test (UAT) bersama klien | Hasil UAT | Tester | 2 |
| **8** | **Penerapan** | **User manual, dok. penerapan, BAST, laporan** | **Tech. Writer** | **14** |
| 8.1 | Deploy final ke hosting & domain | Aplikasi online | Programmer | 4 |
| 8.2 | Penyusunan user manual & dokumen penerapan | User manual, dok. penerapan | Tech. Writer | 7 |
| 8.3 | Pelatihan pengguna (pemilik) | Daftar hadir, materi | Tech. Writer | 4 |
| 8.4 | Penandatanganan BAST & laporan akhir | BAST, laporan | PM | 3 |
| **9** | **Cadangan & Penutupan (Mg 16)** | **Perbaikan akhir, dokumentasi final** | **PM** | **7** |
| 9.1 | Perbaikan akhir & finalisasi dokumentasi | Dokumen final | PM | 7 |

## 6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

Jadwal disusun berdasarkan paket kerja WBS dan mengikuti rencana tanggal pada RD Bagian 11.1: proyek berjalan 16 minggu mulai Senin, 5 Oktober 2026 (Minggu 1) hingga Minggu, 24 Januari 2027 (Minggu 16). Minggu 11 (UTS) dan Minggu 16 (UAS) tidak dijadwalkan untuk pengerjaan utama.

### 6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

| Kode WBS | Tugas | Mulai | Selesai | Durasi (hari) | Pendahulu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Definisi Proyek | Mg 1<br>5 Okt 2026 | Mg 2<br>18 Okt 2026 | 14 | – |
| 3 | Perencanaan | Mg 3<br>19 Okt 2026 | Mg 4<br>1 Nov 2026 | 14 | 2 |


| Kode WBS | Tugas | Mulai | Selesai | Durasi (hari) | Pendahulu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Analisis Kebutuhan | Mg 5<br>2 Nov 2026 | Mg 6<br>15 Nov 2026 | 14 | 3 |
| 5 | Desain Sistem | Mg 7<br>16 Nov 2026 | Mg 8<br>29 Nov 2026 | 14 | 4 |
| 6 | Pemrograman (Sprint 1–3) | Mg 9<br>30 Nov 2026 | Mg 12<br>27 Des 2026 | 28 | 5 |
| 7 | Pengujian | Mg 13<br>28 Des 2026 | Mg 13<br>3 Jan 2027 | 7 | 6 |
| 8 | Penerapan | Mg 14<br>4 Jan 2027 | Mg 15<br>17 Jan 2027 | 14 | 7 |
| 9 | Cadangan & Penutupan (Mg 16) | Mg 16<br>18 Jan 2027 | Mg 16<br>24 Jan 2027 | 7 | 8 |

*Ketergantungan antar-paket level 2 (jenis Finish-to-Start; 5.2 dan 5.3 berjalan paralel, begitu pula 6.3 dan 6.4, serta 8.1 dan 8.2) ditampilkan pada kolom "Pend." di Gambar 6.1.*

## 6.2 Milestone

| Kode | Milestone | Minggu | Tanggal Target | Bukti Tercapai |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Requirement Document disetujui klien | 2 | 18 Okt 2026 | Lembar persetujuan klien |
| M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | 4 | 1 Nov 2026 | Dokumen 01 Bagian II |
| M3 | SRS selesai | 6 | 15 Nov 2026 | Dokumen SRS |
| M4 | SDD selesai | 8 | 29 Nov 2026 | Dokumen SDD |
| M5 | Demo Sprint 1 | 9 | 6 Des 2026 | Demo kepada klien |
| M6 | Demo Sprint 2 | 10 | 13 Des 2026 | Demo kepada klien |
| M7 | Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap | 12 | 27 Des 2026 | Aplikasi + dokumen implementasi |
| M8 | UAT diterima klien | 13 | 3 Jan 2027 | Hasil UAT |
| M9 | Pelatihan & BAST | 15 | 17 Jan 2027 | BAST bertanda tangan |

## 6.3 Gantt Chart

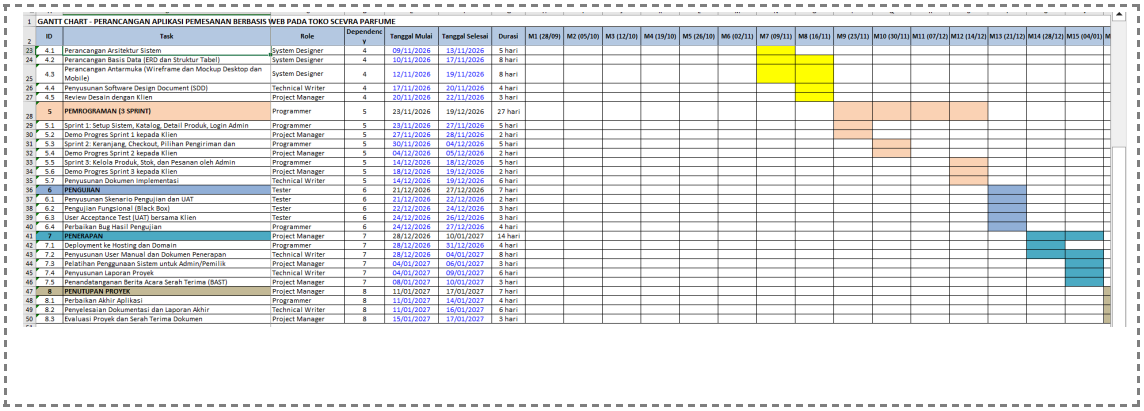

GANTT CHART - PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

| ID | Task | Role | Dependency | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | M1 (28/09) | M2 (05/10) | M3 (12/10) | M4 (19/10) | M5 (26/10) | M6 (02/11) | M7 (09/11) | M8 (16/11) | M9 (23/11) | M10 (30/11) | M11 (07/12) | M12 (14/12) | M13 (21/12) | M14 (28/12) | M15 (04/01) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Perancangan Arsitektur Sistem | System Designer | 4 | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel) | System Designer | 4 | 10/11/2026 | 17/11/2026 | 8 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile) | System Designer | 4 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 8 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Penyusunan Software Design Document (SDD) | Technical Writer | 4 | 17/11/2026 | 20/11/2026 | 4 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Review Desain dengan Klien | Project Manager | 4 | 20/11/2026 | 23/11/2026 | 5 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PEMROGRAMAN (3 SPRINT) | Programmer | 5 | 23/11/2026 | 19/12/2026 | 27 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sprint 1: Setup Sistem, Katalog, Detail Produk, Login Admin | Programmer | 5 | 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Demo Progres Sprint 1 kepada Klien | Project Manager | 5 | 27/11/2026 | 28/11/2026 | 2 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Sprint 2: Keranjang, Checkout, Pilihan Pengiriman dan | Programmer | 5 | 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Demo Progres Sprint 2 kepada Klien | Project Manager | 5 | 04/12/2026 | 05/12/2026 | 2 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Sprint 3: Kelola Produk, Stok, dan Pesanan oleh Admin | Programmer | 5 | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Demo Progres Sprint 3 kepada Klien | Project Manager | 5 | 18/12/2026 | 19/12/2026 | 2 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Penyusunan Dokumen Implementasi | Technical Writer | 5 | 14/12/2026 | 19/12/2026 | 6 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PENGUJIAN | Tester | 6 | 21/12/2026 | 27/12/2026 | 7 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Penyusunan Skenario Pengujian dan UAT | Tester | 6 | 21/12/2026 | 22/12/2026 | 2 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Pengujian Fungsional (Black Box) | Tester | 6 | 22/12/2026 | 24/12/2026 | 3 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | User Acceptance Test (UAT) bersama Klien | Tester | 6 | 24/12/2026 | 26/12/2026 | 3 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Perbaikan Bug Hasil Pengujian | Programmer | 6 | 24/12/2026 | 27/12/2026 | 4 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PENERAPAN | Project Manager | 7 | 28/12/2026 | 10/01/2027 | 14 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Deployment ke Hosting dan Domain | Programmer | 7 | 28/12/2026 | 31/12/2026 | 4 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Penyusunan User Manual dan Dokumen Penerapan | Technical Writer | 7 | 28/12/2026 | 04/01/2027 | 8 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Pelatihan Penggunaan Sistem untuk Admin/Pemilik | Project Manager | 7 | 04/01/2027 | 06/01/2027 | 3 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Penyusunan Laporan Proyek | Technical Writer | 7 | 04/01/2027 | 09/01/2027 | 6 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) | Project Manager | 7 | 08/01/2027 | 10/01/2027 | 3 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PENUTUPAN PROYEK | Project Manager | 8 | 11/01/2027 | 17/01/2027 | 7 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Perbaikan Akhir Aplikasi | Programmer | 8 | 11/01/2027 | 14/01/2027 | 4 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Penyelesaian Dokumentasi dan Laporan Akhir | Technical Writer | 8 | 11/01/2027 | 16/01/2027 | 6 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Evaluasi Proyek dan Serah Terima Dokumen | Project Manager | 8 | 15/01/2027 | 17/01/2027 | 3 hari | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek**

## 7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Pemantauan dilakukan dengan tiga cara. Pertama, tim berkoordinasi lewat WhatsApp group setiap 2 hari dan rapat mingguan sekitar 30–60 menit untuk mengevaluasi progres, PM mencatat hasilnya sebagai notulen. Kedua, review dengan klien dilakukan sekali seminggu melalui WhatsApp atau Google Meet pada waktu luang pemilik, ditambah demo progres pada akhir setiap sprint (Minggu 9, 10, dan 12) dan UAT pada Minggu 13. Ketiga, setiap PIC melaporkan progres paket kerjanya kepada PM paling lambat sehari sebelum rapat mingguan, lalu PM memperbarui kolom realisasi di Gantt Chart dan daftar risiko setiap minggu.

Status paket kerja pada Gantt Chart:

| Status | Arti |
|---|---|
| ✓ Selesai | Paket kerja selesai dan deliverable diterima |
| Terlambat | Melewati tanggal selesai rencana dan belum selesai |
| Revisi | Sudah selesai, tetapi diperbaiki atas masukan klien atau dosen |
| Belum | Belum dimulai atau belum jatuh tempo |

## 8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Tim menggunakan Claude (Anthropic) sebagai alat bantu AI dalam menyusun draf dokumen ini, yaitu uraian proses bisnis As-Is dan To-Be, tabel modul dan teknologi, analisis kelayakan, struktur WBS, jadwal, serta diagram (gambaran sistem, WBS, dan Gantt Chart). Data dari RD Bagian I (jumlah transaksi, biaya hosting dan domain,

perangkat klien, dan jadwal) dipakai sebagaimana tertulis. Asumsi yang tidak berasal dari klien (nilai rata-rata pesanan, persentase biaya marketplace, persentase pengalihan pesanan, nilai waktu pemilik, dan nilai jasa tim) ditandai pada Bagian 4.2 dan akan divalidasi dengan klien. Seluruh isi ditinjau dan menjadi tanggung jawab tim.
