KELOMPOK 1

Home Store Gallery Contact

Scevra Parfume



Pembuatan Website Pemesanan Online UMKM Scevra Parfume

Dibuat Oleh : Adrian, Alif, Alyssa, Amanda, Cyntia

Latar Belakang

Scevra Parfume merupakan usaha parfum milik Fiolim Amadeo yang saat ini berjualan sebagai reseller melalui Shopee dan TikTok selama kurang lebih satu tahun. Klien berencana membangun merek parfum sendiri dan mengembangkan penjualan mandiri melalui website resmi serta media sosial.

Masalah yang dihadapi klien :

- Peningkatan biaya administrasi marketplace berdampak pada penurunan keuntungan usaha.
- Pengelolaan stok masih dilakukan secara manual sehingga perlu sistem pencatatan yang lebih terpusat.
- Penjualan dan branding masih bergantung pada platform marketplace sehingga klien membutuhkan media penjualan mandiri.

Solusi

Mengembangkan aplikasi pemesanan parfum berbasis web yang responsif sebagai media branding dan penjualan mandiri. Website dilengkapi katalog dan detail produk, keranjang belanja, voucher, checkout, pilihan pengiriman, serta pembayaran. Halaman admin digunakan untuk mengelola produk, stok, pesanan, dan voucher agar proses penjualan lebih terstruktur.



FAQ kebutuhan Website



APA SAJA KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM?

01. Fungsi-Fungsi Utama Pada Website

PELANGGAN

- Login
- Menampilkan katalog produk parfum
- Melihat detail produk (foto, harga, stok, deskripsi)
- Memilih dan memasukkan produk ke dalam keranjang belanja
- Memasukkan kode voucher diskon/promo
- Checkout dan pengisian data pemesanan (nama, kontak, alamat)
- Memilih jasa ekspedisi/metode pengiriman
- Melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau transfer debit

ADMIN

- Mengelola data produk dan stok (tambah, ubah, hapus)
- Mengelola pesanan (melihat pesanan masuk, memverifikasi pembayaran, mengubah status, mengisi nomor resi manual)
- Mengelola data voucher promo (tambah, ubah, hapus masa berlaku/diskon)

FAQ kebutuhan Website



APA SAJA INFORMASI MASUKAN DAN KELUARAN SECARA UMUM?

02. Informasi Masukan dan Keluaran Umum

- Masukan

Data Masukan	Sumber	Frekuensi	Digunakan untuk Keluaran
Data menu dan status ketersediaan	Admin	Harian	Daftar menu
Data pesanan (item, catatan, kontak pemesan)	Pelanggan	Tiap pesanan	Konfirmasi, rekap
Profil, jam operasional, kontak	Admin	Saat berubah	Halaman informasi

- Keluaran

Informasi Keluaran	Pengguna/Penerima	Frekuensi	Berasal dari Data Masukan
Daftar parfume dan ketersediaan hari ini	Pelanggan	Harian	Data menu, status ketersediaan
Konfirmasi pesanan	Admin	Tiap pesanan	Data pesanan
Daftar pesanan masuk dan statusnya	Admin	Selama jam operasional	Data pesanan, status pesanan

FAQ kebutuhan Website



APA SAJA KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL & LINGKUNGAN OPERASI?

03. Kebutuhan non-fungsional dan lingkungan operasi

Kinerja

- Sistem menangani sekitar 25–28 transaksi per bulan dengan dua varian produk

Perkembangan

- Transaksi dan varian produk diperkirakan tumbuh 25% per tahun
- Basis data dapat dikembangkan untuk penambahan produk, varian, pengguna, dan reseller.

Pengoperasian dan Lingkungan

- Jam operasional sistem pukul 10.00–22.00 WIB
- Sistem membutuhkan koneksi internet melalui WiFi atau data seluler.

Integrasi dan Kompatibilitas

- Sistem dapat diakses melalui laptop dan smartphone.

FAQ
kebutuhan Website




APA SAJA PENGARUH KEORGANISASIAN-NYA?

04. Pengaruh Keorganisasian

- **Kondisi saat ini :** Klien menjalankan penjualan parfum sebagai reseller melalui toko online, sedangkan brand Scevra Parfume sendiri baru memiliki akun media sosial dan toko online.
- **Pihak yang terdampak :** Pemilik usaha yang mengelola seluruh kegiatan secara mandiri, termasuk pengelolaan stok barang.
- **Tingkat perubahan :** Sedang, karena pemilik perlu beradaptasi dengan sistem baru dan memisahkan stok produk reseller dari produk brand sendiri.
- **Masa transisi :** Sekitar 2 minggu, dengan menjalankan pencatatan stok lama dan sistem baru secara bersamaan untuk mencocokkan jumlah stok fisik.
- **Penghentian pencatatan lama :** Pencatatan melalui HP atau buku dihentikan setelah pemilik memastikan data stok pada sistem baru sudah akurat.


Proses Bisnis Saat Ini (As-IS)

- Pelanggan membuka Shopee atau TikTok, melihat katalog parfum, memilih produk, kemudian melakukan checkout.
- Pelanggan memilih metode pengiriman dan pembayaran melalui marketplace. Marketplace memproses pembayaran dan meneruskan informasi pesanan kepada admin setelah pembayaran berhasil.
- Admin menerima pesanan dari marketplace, kemudian menyiapkan parfum sesuai pesanan dan mengemasnya.
- Admin menyerahkan pesanan kepada jasa pengiriman, kemudian memperbarui status pesanan dan nomor resi di marketplace.
- Setelah transaksi selesai, pemilik mencatat data penjualan secara manual menggunakan Excel.

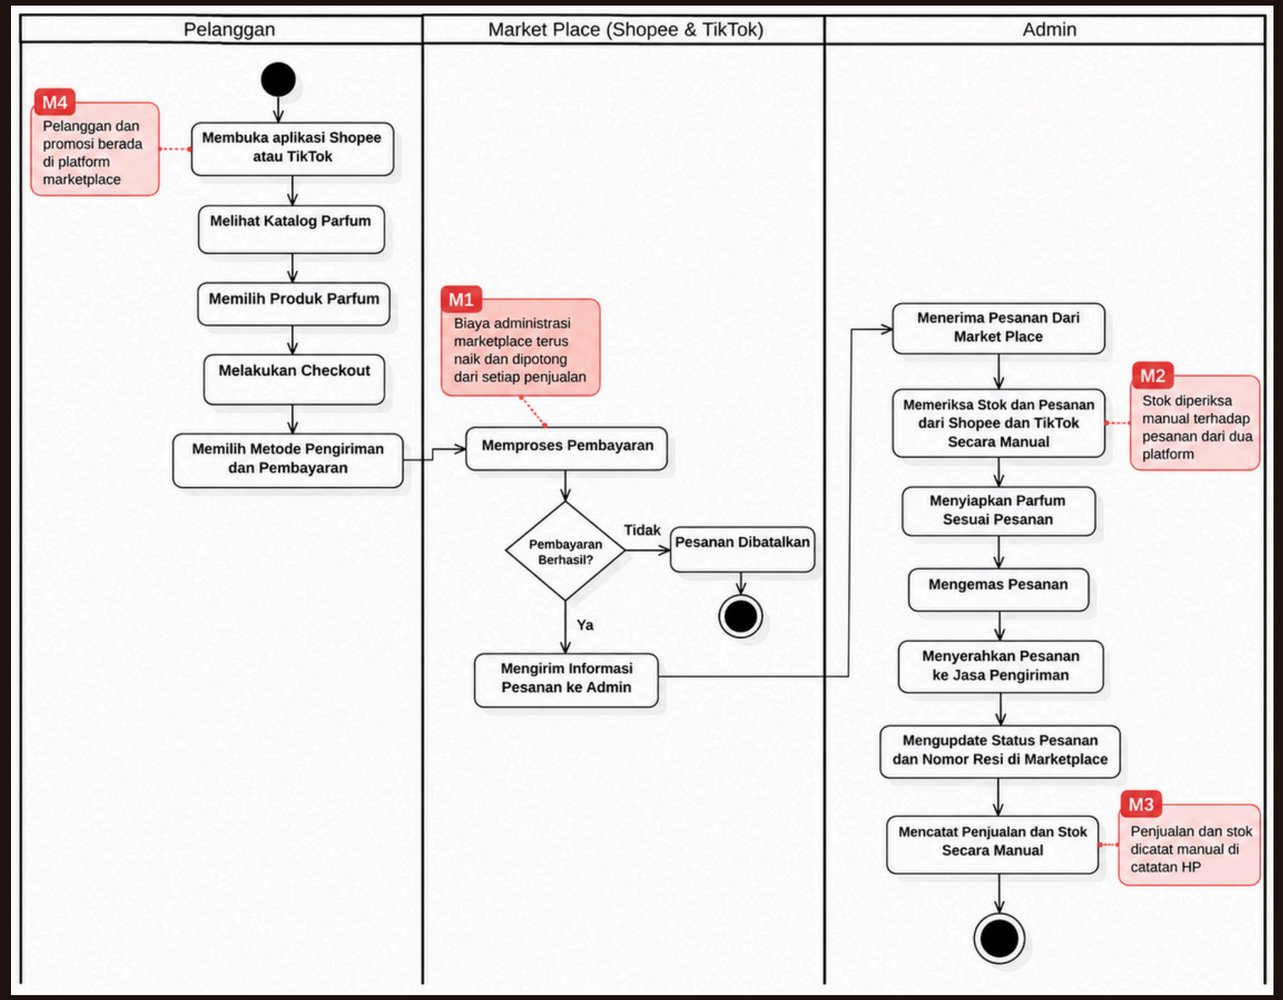

Proses Bisnis Usulan (To-Be)

- Penjualan brand Scevra Parfume dilakukan melalui website resmi.
- Pelanggan mengakses website melalui media sosial atau tautan langsung.
- Pelanggan memilih produk, menggunakan voucher jika tersedia, mengisi data pemesanan, dan memilih ekspedisi.
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui QRIS atau transfer debit.
- Sistem menyimpan pesanan, mengurangi stok secara otomatis, dan mengirimkan konfirmasi melalui email.
- Admin memeriksa dan memvalidasi pembayaran, kemudian memperbarui status pesanan.

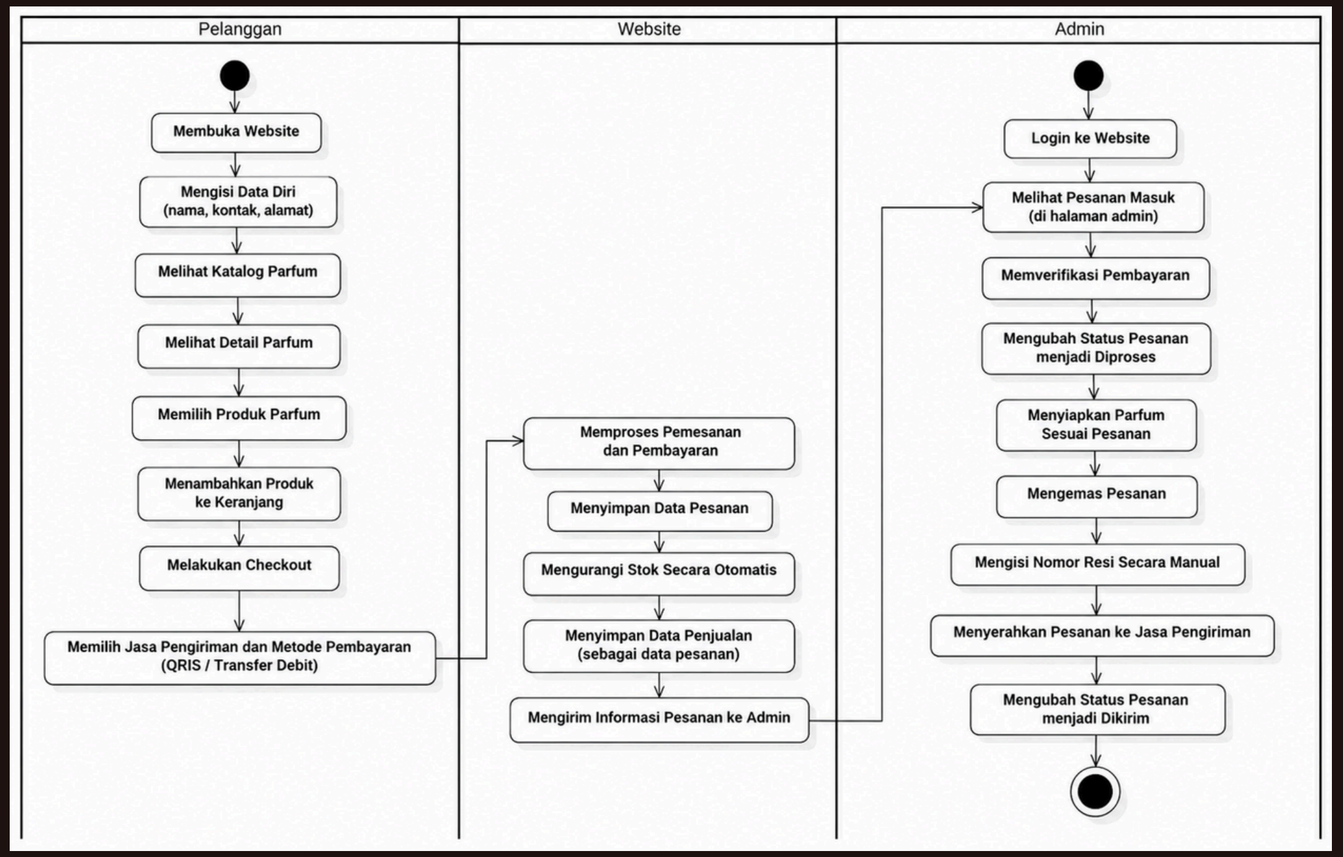

WBS (Work Breakdown Structure)

WBS memecah seluruh pekerjaan menjadi 9 paket level 1 (7 fase perkuliahan ditambah Manajemen Proyek dan Cadangan Minggu 16) dan paket kerja level 2 yang dapat ditugaskan. Aturan 100% dipenuhi: seluruh pekerjaan proyek tercakup dan tidak ada yang tumpang tindih; pekerjaan di luar ruang lingkup RD (misalnya integrasi marketplace dan pengelolaan toko offline) tidak dimasukkan.

01. Diagram WBS



02. Kamus WBS

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Manajemen Proyek**	**Notulen, laporan status**	**PM**	**112 (sepanjang proyek)**
1.1	Rapat mingguan tim & klien	Notulen	PM	112 (mingguan)
1.2	Pemantauan jadwal & risiko	Gantt (realisasi), daftar risiko	PM	112 (mingguan)
2	**Definisi Proyek**	**Requirement Document**	**SA**	**14**
2.1	Identifikasi klien & masalah	Hasil wawancara (9 & 17 Okt)	SA	7
2.2	Penetapan tujuan, ruang lingkup & metodologi	Bagian 2–4 RD	SA	4
2.3	Penyusunan RD & persetujuan klien	RD v1.3 + lembar persetujuan	SA	3
3	**Perencanaan**	**Dokumen 01 Bag. II, Gantt Chart**	**PM**	**14**
3.1	Proses bisnis & gambaran sistem	Bagian 2–3 dokumen ini	SA	5
3.2	Analisis kelayakan	Bagian 4 dokumen ini	PM	5
3.3	WBS & Gantt Chart	Bagian 5–7, file Gantt	PM	4
4	**Analisis Kebutuhan**	**SRS**	**SA**	**14**
4.1	Wawancara & observasi lanjutan	Catatan kebutuhan detail	SA	5
4.2	Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional	Draf SRS	SA	6
4.3	Review SRS bersama klien	SRS final	SA	3
5	**Desain Sistem**	**SDD**	**SD**	**14**
5.1	Perancangan basis data (ERD)	ERD & kamus data	SD	5
5.2	Perancangan arsitektur & alur sistem	Diagram arsitektur, UML	SD	5
5.3	Perancangan antarmuka (wireframe responsif)	Wireframe HP & desktop	SD	7
5.4	Penyusunan & review SDD	SDD	SD	2
6	**Pemrograman**	**Aplikasi, dok. implementasi**	**Programmer**	**28***
6.1	Sprint 1 – fitur dasar (F-01, F-02, F-03, F-09)	Login, katalog, detail & kelola produk	Programmer	7
6.2	Sprint 2 – transaksi (F-04 s.d. F-08, F-11)	Keranjang, voucher, checkout, pembayaran	Programmer	7
6.3	Sprint 3 – pesanan & penyempurnaan (F-10)	Kelola pesanan, cetak, email, chat	Programmer	7
6.4	Penyusunan dokumen implementasi	Dokumen implementasi	Tech. Writer	7
7	**Pengujian**	**Skenario uji & hasil UAT**	**Tester**	**7**
7.1	Penyusunan skenario & data uji	Skenario pengujian	Tester	2
7.2	Pengujian modul, integrasi & perbaikan bug	Laporan pengujian	Tester	3
7.3	User Acceptance Test (UAT) bersama klien	Hasil UAT	Tester	2

WBS (Work Breakdown Structure)

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
8	**Penerapan**	**User manual, dok. penerapan, BAST, laporan**	**Tech. Writer**	**14**
8.1	Deploy final ke hosting & domain	Aplikasi online	Programmer	4
8.2	Penyusunan user manual & dokumen penerapan	User manual, dok. penerapan	Tech. Writer	7
8.3	Pelatihan pengguna (pemilik)	Daftar hadir, materi	Tech. Writer	4
8.4	Penandatanganan BAST & laporan akhir	BAST, laporan	PM	3
9	**Cadangan & Penutupan (Mg 16)**	**Perbaikan akhir, dokumentasi final**	**PM**	**7**
9.1	Perbaikan akhir & finalisasi dokumentasi	Dokumen final	PM	7

JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

01

Jadwal dan Ketergantungan Tugas



Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi (hari)	Pendahulu
2	Definisi Proyek	Mg 1 5 Okt 2026	Mg 2 18 Okt 2026	14	–
3	Perencanaan	Mg 3 19 Okt 2026	Mg 4 1 Nov 2026	14	2
4	Analisis Kebutuhan	Mg 5 2 Nov 2026	Mg 6 15 Nov 2026	14	3
5	Desain Sistem	Mg 7 16 Nov 2026	Mg 8 29 Nov 2026	14	4
6	Pemrograman (Sprint 1–3)	Mg 9 30 Nov 2026	Mg 12 27 Des 2026	28	5
7	Pengujian	Mg 13 28 Des 2026	Mg 13 3 Jan 2027	7	6
8	Penerapan	Mg 14 4 Jan 2027	Mg 15 17 Jan 2027	14	7
9	Cadangan & Penutupan (Mg 16)	Mg 16 18 Jan 2027	Mg 16 24 Jan 2027	7	8

02


Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Tanggal Target	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	2	18 Okt 2026	Lembar persetujuan klien
M2	Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai	4	1 Nov 2026	Dokumen 01 Bagian II
M3	SRS selesai	6	15 Nov 2026	Dokumen SRS
M4	SDD selesai	8	29 Nov 2026	Dokumen SDD
M5	Demo Sprint 1	9	6 Des 2026	Demo kepada klien
M6	Demo Sprint 2	10	13 Des 2026	Demo kepada klien
M7	Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	27 Des 2026	Aplikasi + dokumen implementasi
M8	UAT diterima klien	13	3 Jan 2027	Hasil UAT
M9	Pelatihan & BAST	15	17 Jan 2027	BAST bertanda tangan


Jadwal disusun berdasarkan paket kerja WBS dan mengikuti rencana tanggal pada RD Bagian 11.1: proyek berjalan 16 minggu mulai Senin, 5 Oktober 2026 (Minggu 1) hingga Minggu, 24 Januari 2027 (Minggu 16). Minggu 11 (UTS) dan Minggu 16 (UAS) tidak dijadwalkan untuk pengerjaan utama.

JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

No	Aktivitas	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Durasi (Minggu)
1	Definisi Proyek	05-Oct-2026	18-Oct-2026	2
2	Perencanaan	19-Oct-2026	01-Nov-2026	2
3	Analisis Kebutuhan	02-Nov-2026	15-Nov-2026	2
4	Desain Sistem	16-Nov-2026	29-Nov-2026	2
5	Pemrograman	30-Nov-2026	27-Dec-2026	4
6	Pengujian	28-Dec-2026	03-Jan-2027	1
7	Penerapan	04-Jan-2027	17-Jan-2027	2

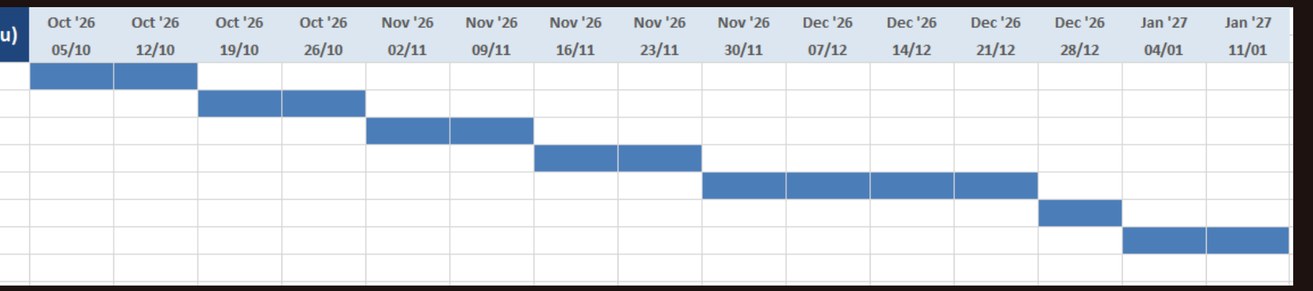

No	Aktivitas	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Durasi/Minggu
1	Definisi Proyek	05-Okt-26	18-Okt-26	2
2	Perencanaan	19-Okt-26	01-Nov-26	2
3	Analisis Kebutuhan	02-Nov-26	15-Nov-26	2
4	Desain Sistem	16-Nov-26	29-Nov-26	2
5	Pemrograman	30-Nov-26	27-Des-26	4
6	Pengujian	28-Des-26	03-Jan-27	1
7	Penerapan	04-Jan-27	17-Jan-27	2

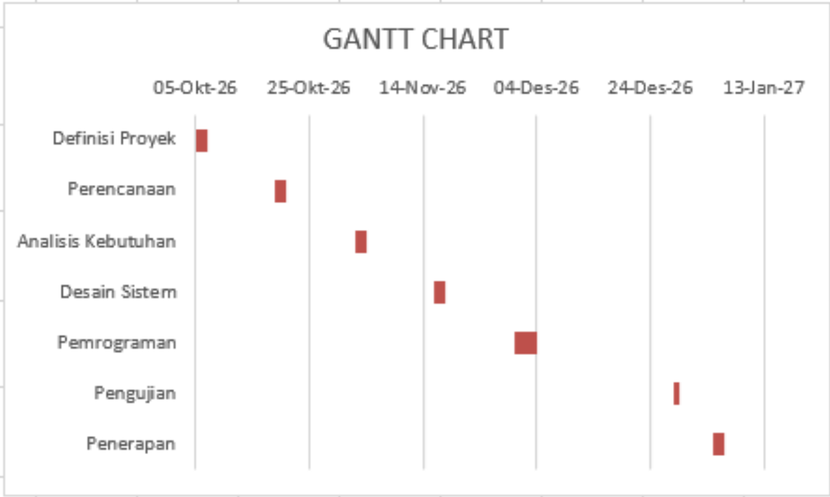

Dokumentasi Wawancara (W2)





Lokasi Pertemuan :

Nautic Coffee, Jakarta Pusat

KELOMPOK 1

Home Store Gallery Contact

Log In



Thank You

