PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-7

Fase 4 · Desain Sistem



Kelompok · Kelas

Kelompok 1 · 4KA22

Proyek · Klien

Perancangan Aplikasi Web Scevra Parfume · Fiolim Amadeo

Pelapor · Tanggal

Alyssa Salma · 09 November 2026

ANGGOTA KELOMPOK



Alyssa Salma

Project Manager



Adrian Taufiqurrahman

System Analyst



Alif Rahman

Programmer



Amanda Talitha

UI/UX Designer



Cyntia Gladies

Tester & Technical Writer



Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

58%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

46%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6	Mg 7–8 · kini	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	Desain	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**





Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
4.1	Perancangan Arsitektur Sistem	Amanda Talitha	16 November	Progress	
4.2	Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel)	Amanda Talitha	16 November	Progress	
4.3	Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile)	Amanda Talitha	23 November	Belum	
4.4	Penyusunan Software Design Document (SDD)	Amanda Talitha	16 November	Progress	
4.5	Review Desain dengan Klien	Alyssa Salma	23 November	Belum	

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)



Selesai 1 dari 5 tugas




Hasil kerja minggu ini

Pembuatan Diagram Arsitektur Sistem

- kode 4.1 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.2

Menyesuaikan Use Case dengan kebutuhan Klien dari Sisi Admin dan pelanggan

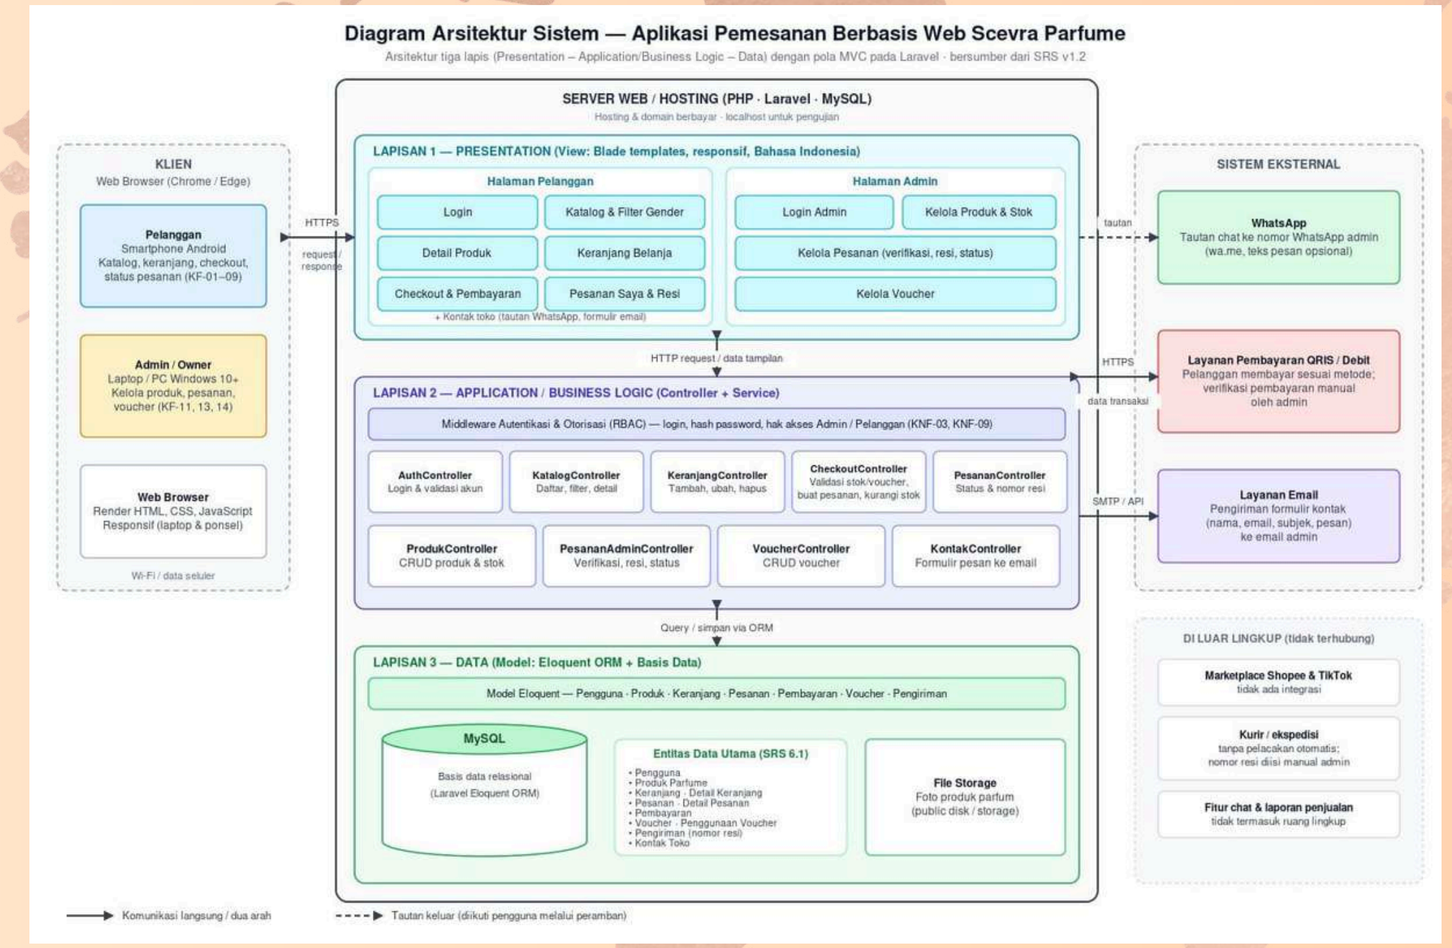





Hasil kerja minggu ini

Proses Pembuatan Sequence Diagram

- kode 4.1 WBS

Tercantum pada Dokumen SDD Bagian 3.3

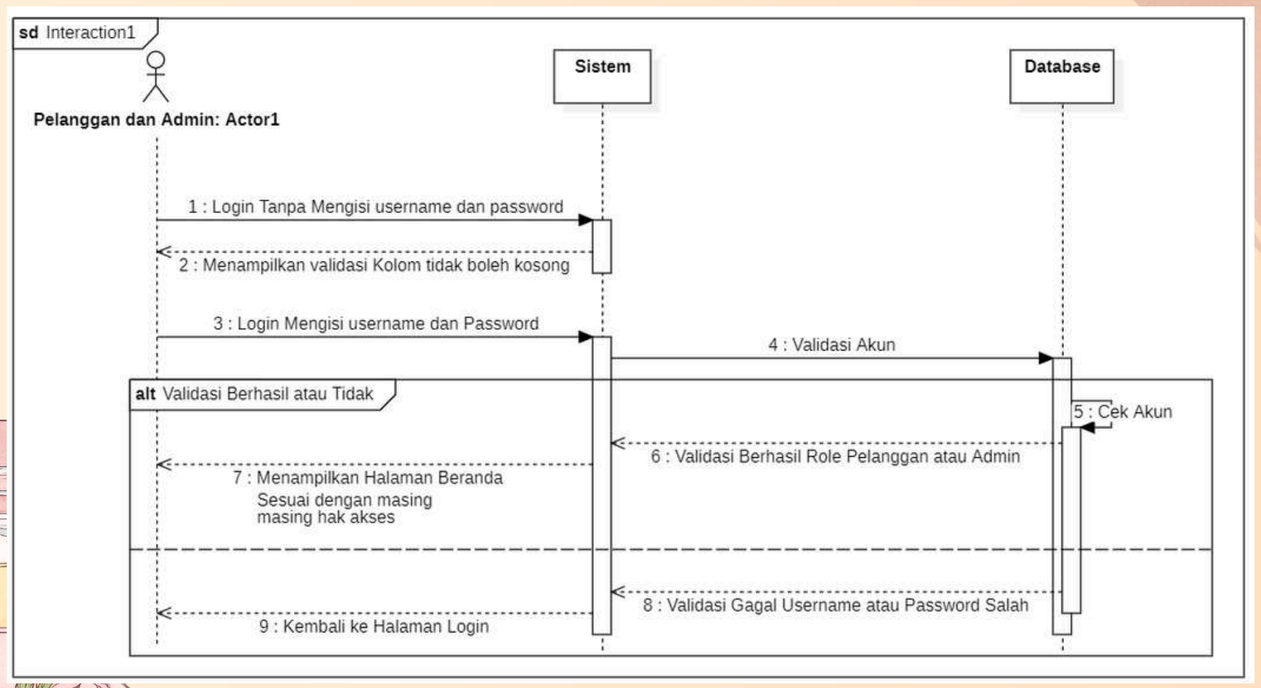


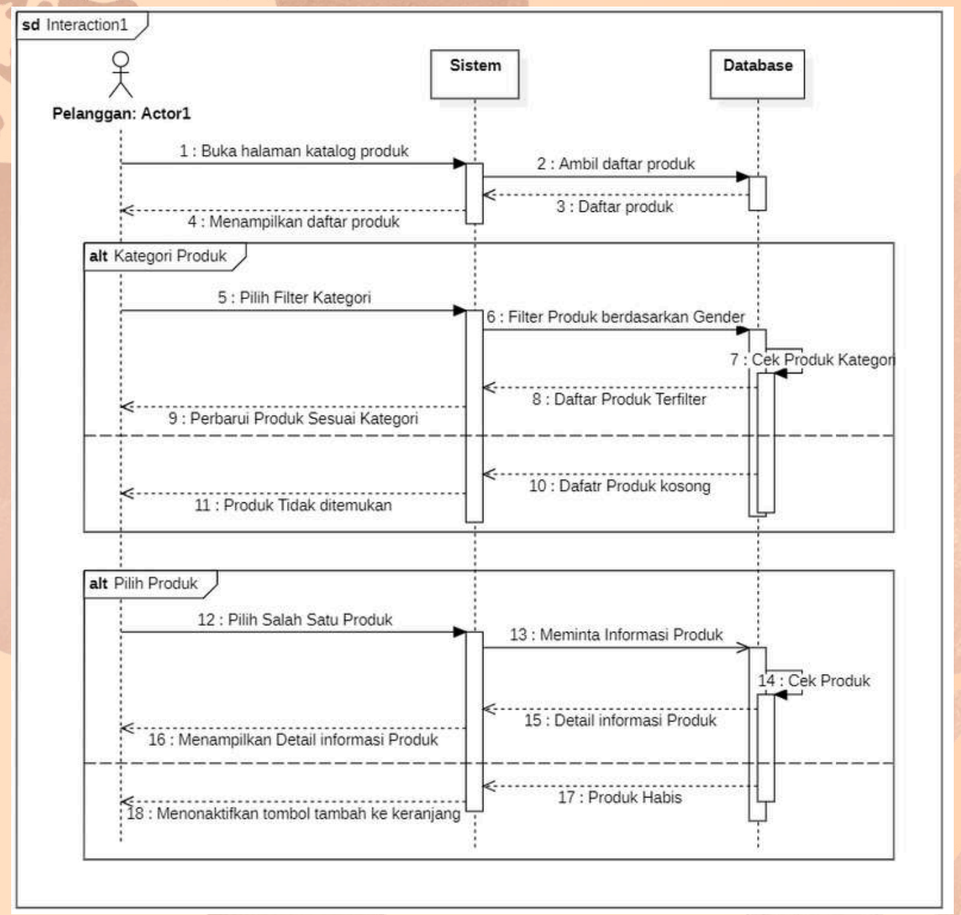

Hasil kerja minggu ini

Pembuatan Arsitektur Penerapan (Deployment)

Tercantum pada Dokumen SDD Bagian 3.4

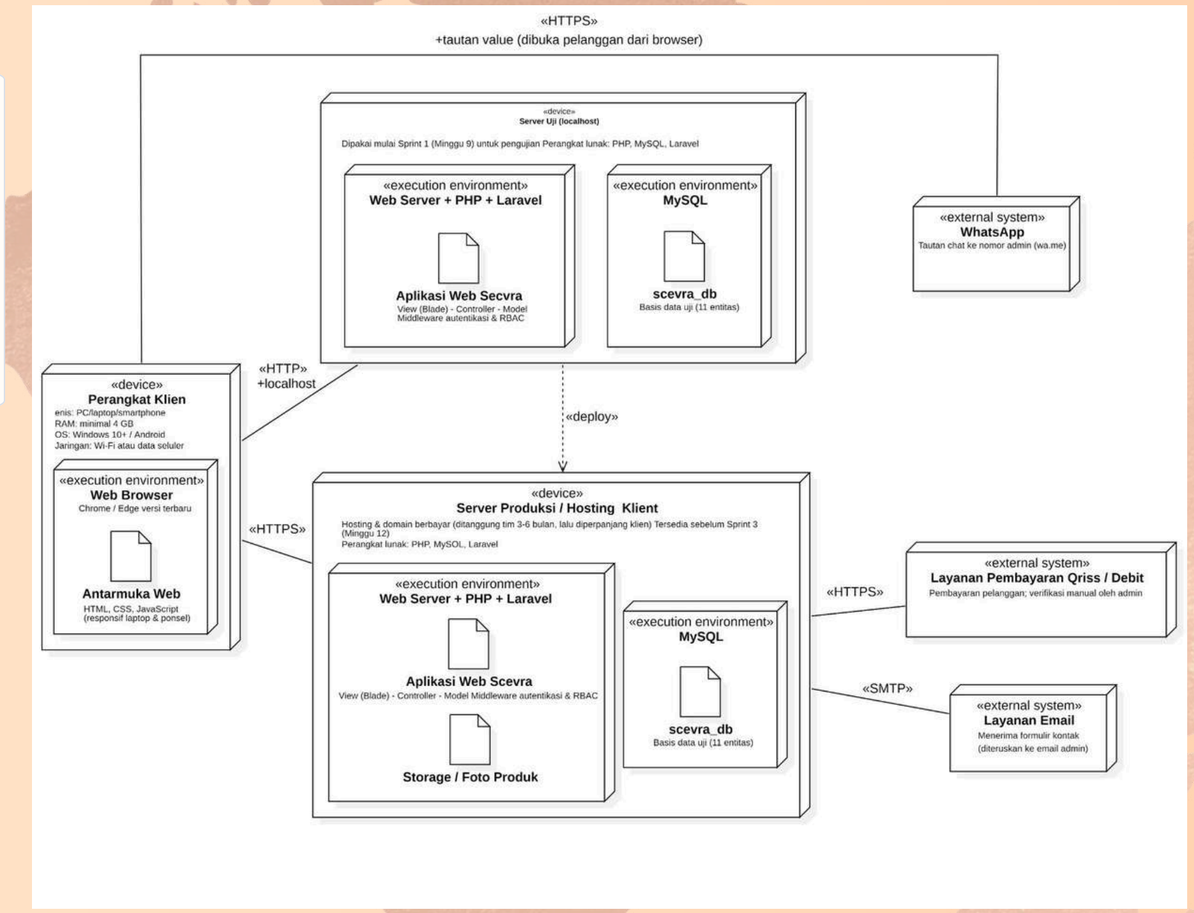




Hasil kerja minggu ini

Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

Tercantum pada Dokumen SDD Bagian 5.1

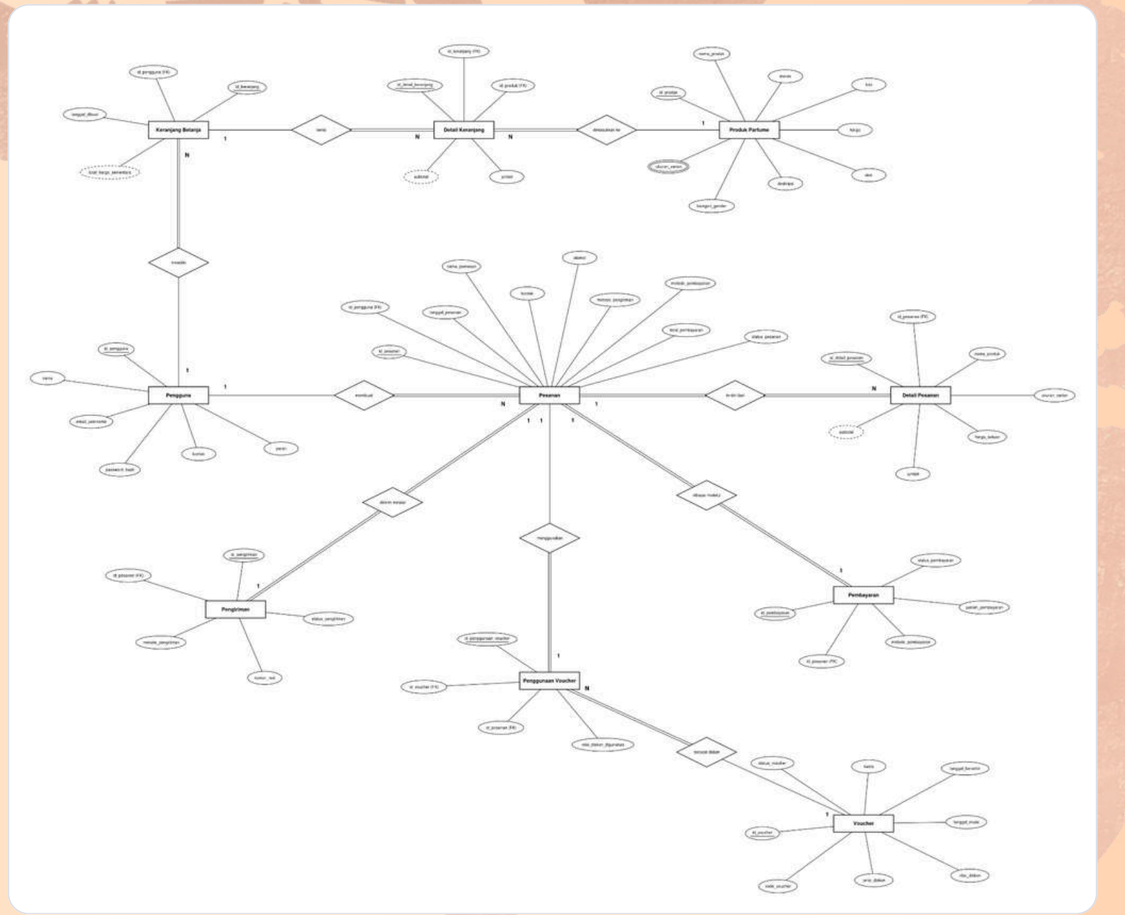

Pembuatan Spesifikasi UC dan User Story

- kode 4.2 WBS

Tercantum pada Dokumen SDD Bagian 4.2

Melakukan Penyusunan ERD



Kontribusi anggota Minggu 6 (Penyusunan SRS)

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Alyssa Salma	Project Manager	4.5 Memimpin rapat klien	8 jam
Adrian Taufiqurrahman	System Analyst	4.1 Perancangan Arsitektur Sistem Membuat Diagram	8 jam
Amanda Talitha	System Designer	4.2 Perancangan Basis Data ERD	8 jam
Alif Rahman	Programmer	4.4 Menyusun PPT	8 jam
Cyntia Gladies	Tester	4.4 Menyusun PPT, upload dokumentasi	8 jam
	Technical Writer		

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.



Komunikasi dengan klien

Pertemuan

- 9 Oktober 2026 · WhatsApp
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim
- 17 Oktober 2026 · tatap muka
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim
- 01 November 2026 · Google Meet
  Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim

Yang dibahas

- Alur website, mulai dari pemilihan produk, checkout, hingga proses pemesanan.
- Metode pembayaran, yaitu QRIS manual atau menggunakan payment gateway Midtrans.
- Biaya penggunaan Midtrans serta ketentuan biaya transaksi.
- Konsep tampilan website, meliputi pemilihan warna dan jenis font yang akan digunakan.

Masukan dan keputusan klien

Klien menyetujui alur website dan penggunaan Midtrans dengan metode pembayaran QRIS. Biaya transaksi akan disesuaikan melalui harga jual produk. Tampilan website mengacu pada Octarine dengan desain minimalis berwarna hitam dan putih, sedangkan font akan disesuaikan dengan logo yang dibuat klien.

Perubahan kebutuhan

Tidak ada perubahan kebutuhan.

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-01	Klien sulit ditemui	Tinggi	Jadwal rutin tiap Sabtu, konfirmasi H-1	PM
R-02	Ruang lingkup terus bertambah (fitur baru diminta di tengah jalan)	Sedang	Kunci ruang lingkup di dokumen persetujuan, perubahan lewat form khusus	SA
R-03	Anggota tim sakit atau tidak aktif	Sedang	Dokumentasi rapi dan tiap tugas punya cadangan PIC	TW

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

tidak ada



Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.1	Perancangan Arsitektur Sistem	Amanda Talitha	16 November
4.2	Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel)	Amanda Talitha	16 November
4.3	Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile)	Amanda Talitha	23 November
4.4	Penyusunan Software Design Document (SDD)	Amanda Talitha	16 November
4.5	Review Desain dengan Klien	Alyssa Salma	23 November

JATUH TEMPO

Minggu 8
Penyusunan Software Design Document (SDD) : 15 November 2026





THANK YOU



