PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-5

Fase 3 · Analisis Kebutuhan



Kelompok · Kelas

Kelompok 1 · 4KA22

Proyek · Klien

Perancangan Aplikasi Web Scevra Parfume · Fiolim Amadeo

Pelapor · Tanggal

Alyssa Salma · 26 Oktober 2026

ANGGOTA KELOMPOK



Alyssa Salma

Project Manager



Adrian Taufiqurrahman

System Analyst



Alif Rahman

Programmer



Amanda Talitha

UI/UX Designer



Cyntia Gladies

Tester & Technical Writer



Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

42%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

28%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**






Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
3.5	Penyusunan dan Review SRS bersama Klien	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Progress	Belum
3.4	Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW)	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Selesai	✓
3.3	Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram	Adrian Taufiqqurahman	2 November	Progress	Belum
3.2 , 3.1	Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional dan validasi kebutuhan dari klien	Adrian Taufiqqurahman	26 Oktober	Selesai	✓

Selesai 3 dari 5 tugas

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)





Hasil kerja minggu ini

Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW)

- kode 3.4 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.1

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus menampilkan katalog produk parfum beserta foto, nama, dan harga.	Pelanggan	Must	W-01	F-02
KF-02	Sistem harus menyediakan penyaringan produk berdasarkan nama atau gender.	Pelanggan	Should	RD 6.1	F-02
KF-03	Sistem harus menampilkan detail produk: foto, harga, stok, deskripsi, dan pilihan ukuran.	Pelanggan	Must	W-01, RD 5.1	F-03
KF-04	Sistem harus memungkinkan pelanggan menambah, mengubah jumlah, dan menghapus produk di keranjang belanja.	Pelanggan	Must	W-02	F-04
KF-05	Sistem harus menyediakan checkout dengan pengisian data pemesan (nama, kontak, alamat).	Pelanggan	Must	W-02	F-06




Hasil kerja minggu ini

Perancangan Use Case Diagram

- kode 3.3 WBS

Tercantum pada Dokumen SRS Bagian 4.2

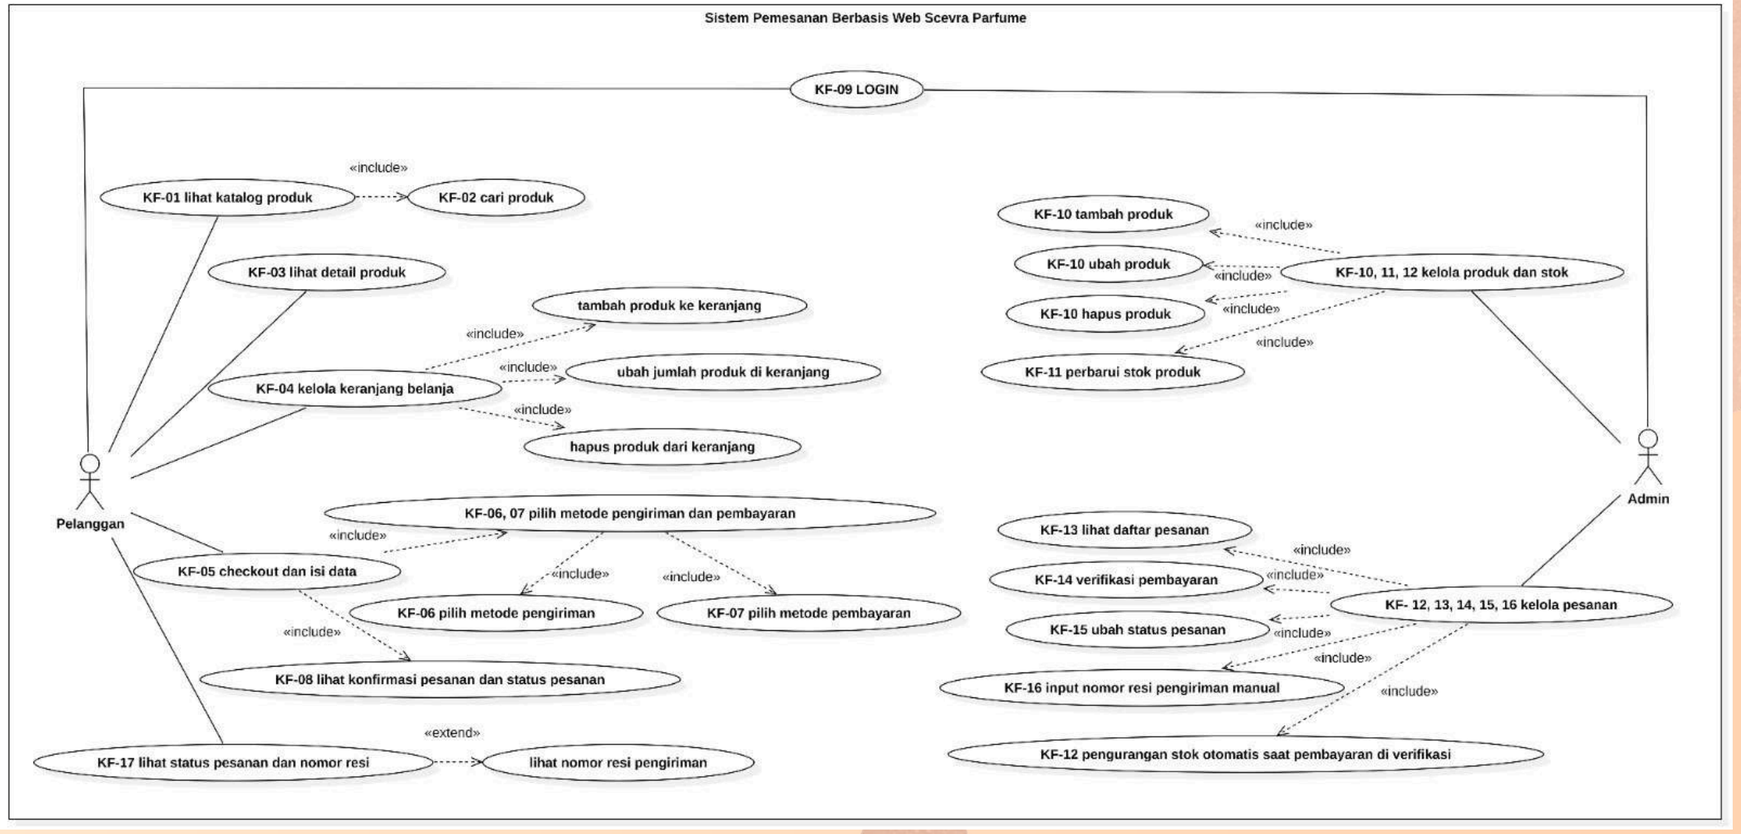

Kontribusi anggota Minggu 5 (Penyusunan SRS)

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Alyssa Salma	Project Manager	3.5 Memperbarui Gantt, memimpin rapat klien	
Adrian Taufiqurrahman	System Analyst	3.5 Menyusun SRS	
Amanda Talitha	System Designer	3.5 Membuat Diagram	
Alif Rahman	Programmer	3.5 Menyusun PPT	
Cyntia Gladies	Tester	3.5 Menyusun PPT, upload dokumentasi	
	Technical Writer		

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.



Komunikasi dengan klien

Pertemuan

9 Oktober 2026 · WhatsApp
Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim

17 Oktober 2026 · tatap muka
Hadir: Fiolim Amadeo & anggota tim

Yang dibahas

- Kebutuhan website untuk branding dan penjualan mandiri.
- Alur pemesanan: memilih produk, checkout, memilih pengiriman, dan metode pembayaran.
- Preferensi tampilan website yang berfokus pada desktop dan mobile.

Masukan dan keputusan klien

Website dirancang untuk pelanggan dan admin, dengan pengelolaan produk serta pesanan. Verifikasi pembayaran dan pengisian nomor resi dilakukan secara manual oleh admin.

Perubahan kebutuhan

tidak ada

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-01	Klien sulit ditemui	Tinggi	Jadwal rutin tiap Sabtu, konfirmasi H-1	PM
R-02	Ruang lingkup terus bertambah (fitur baru diminta di tengah jalan)	Sedang	Kunci ruang lingkup di dokumen persetujuan, perubahan lewat form khusus	SA

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

[tidak ada / pertanyaan atau keputusan yang perlu arahan dosen]



Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
3.5	Penyusunan dan Review SRS bersama Klien	Adrian Taufiqqurahman	2 November
3.4	Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram	Adrian Taufiqqurahman	2 November
4.1	Perancangan Arsitektur Sistem	Amanda Talitha	16 November
4.2	Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel)	Amanda Talitha	16 November

JATUH TEMPO

Pertemuan klien: belum dijadwalkan





THANK YOU



